


岐阜県公共施設等総合管理基本方針の 概要と進捗状況について

(令和 6 年度)

インフラ長寿命化計画に係る計画体系

インフラ長寿命化計画の体系

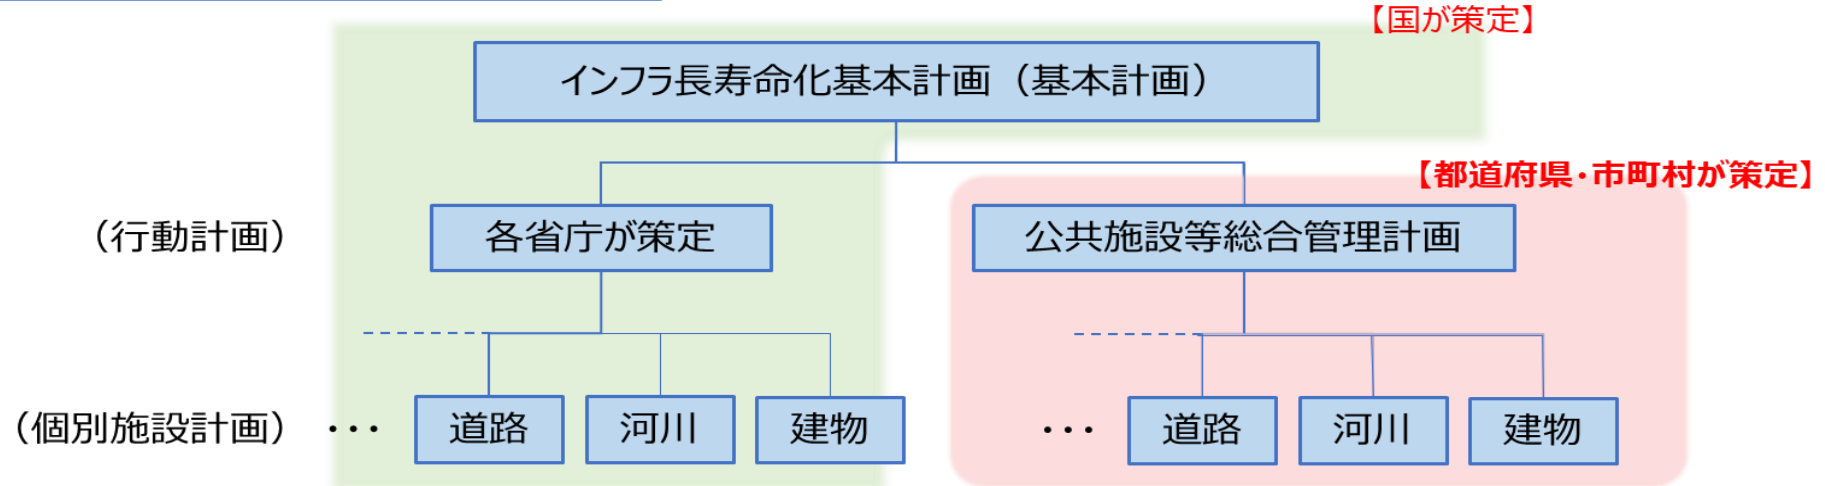


本県のインフラ長寿命化計画の体系

行動計画

岐阜県公共施設等総合管理基本方針（国が策定を要請する公共施設等総合管理計画）

個別施設計画
（施設類型ごとの
長寿命化計画）

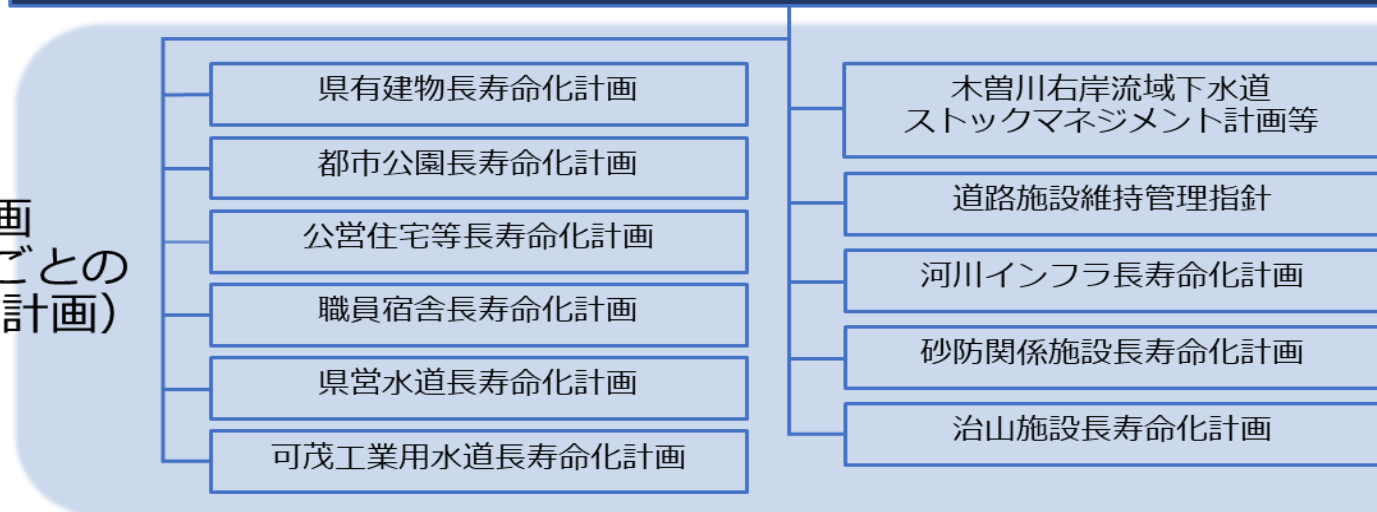

岐阜県公共施設等総合管理基本方針について

基本方針の概要

(計画期間) 2015 (平成27) 年度 ～ 2024 (令和6) 年度 (10年間)

(公共施設等の管理に関する基本的な考え方)

1. 適切な管理により、突発的な不具合による利用停止や事故等を防止
2. 予防保全（不具合が生じる前に修繕・交換、機能・性能を維持）の考え方を取り入れ、優先順位を設定して計画的に維持保全等を実施することなどにより、長寿命化や財政負担の最小化・平準化を推進
3. 老朽化等の再整備に際しては、施設そのものの必要性や適正規模を精査した上で、拡充・縮小・転用・統合・廃止等を検討

目標指標

○令和20年度までに必要と考えられる建物に要する経費（維持管理、維持保全及び再整備）の総額について30%程度削減

その他


○各長寿命化計画の予算措置状況や対策の進捗状況について確認

目標指標（建物に要する経費30%程度削減）について

○使用年数65年を目標に予防保全などの長寿命化対策を行った場合の建物に要する経費の「実績」は、使用年数50年で長寿命化対策を行わない場合の「見込み」と比較し、約28%の経費削減効果があった。（平成27年度～令和5年度累計）

建物に要する経費（※1）の見込みと実績との比較

使用年数50年を迎える建物集中し、その再整備費が建物に要する経費の見込み額を押し上げているが、**使用年数を65年に延ばし、再整備を先送りしたことにより、実績額が圧縮され削減効果（見込みと実績との差）が得られた**

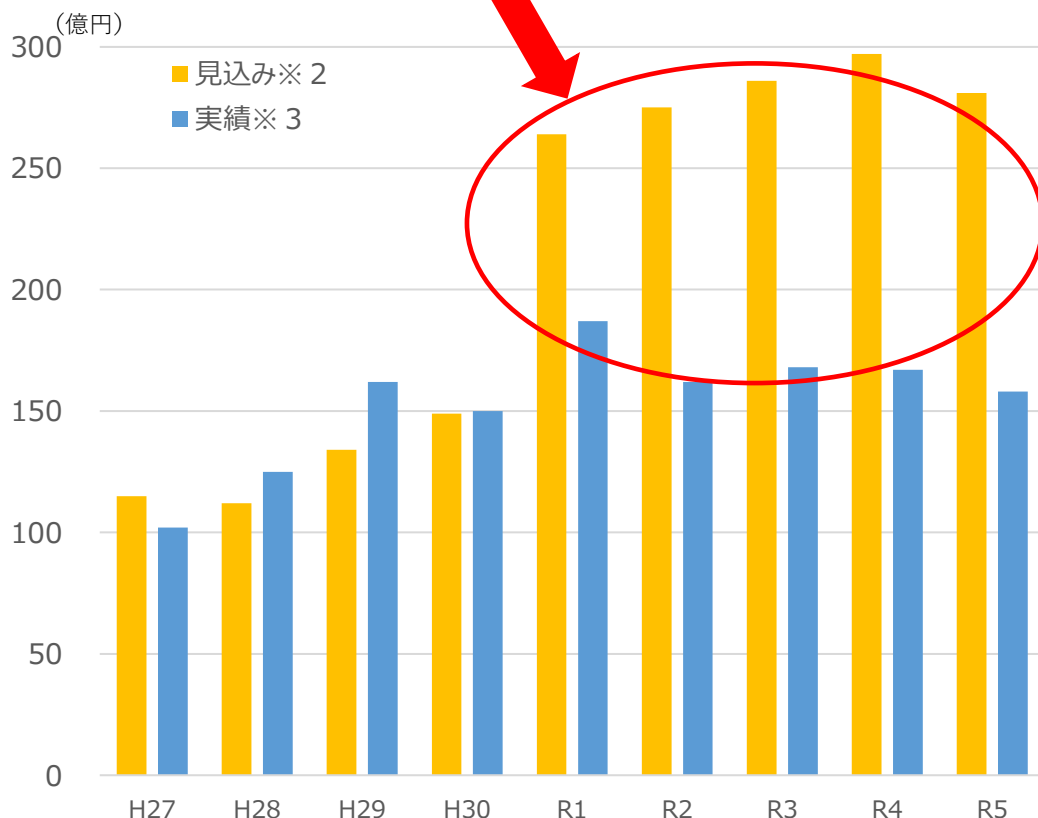

年度	見込み ※2 (億円)		実績 ※3 (億円)		削減率 (累計)
	年度毎	累計	年度毎	累計	
H27	115	115	102	102	11%
H28	112	227	125	227	0%
H29	134	361	162	389	-8%
H30	149	510	150	539	-6%
R1	264	774	187	726	6%
R2	275	1,049	162	888	15%
R3	286	1,335	168	1,056	21%
R4	297	1,632	167	1,223	25%
R5	281	1,913	158	1,381	28%

※1：庁舎・事務所、教育・文化・体育施設、学校、警察施設、県営住宅、公園、職員宿舍等に係る「維持管理費・維持保全費・再整備費」を指す。

※2：使用年数50年（県営住宅は70年）で再整備をする想定のもと、長寿命化対策を行わない場合の基本方針策定時の見込み。

また、建物に要する経費見込みのうち、再整備費については、各年度ごとの物価変動分を加算する。

※3：使用年数65年（県営住宅は85年）を目標に長寿命化対策を行った場合の実績。

参考（各長寿命化計画の予算措置状況・対策の進捗状況）

○以下の長寿命化計画について、令和6年度までの計画額と予算措置状況との比較を行った。

○総じて、いずれの計画もおおむね計画どおりの予算措置がされている。

（単位：億円）

計 画 名	累計計画額 (a)	累計予算額 (b)	差（対計画額比） (b-a (b/a))
県有建物長寿命化計画	1,604.70	1,672.60	67.90 (104.2%)
都市公園長寿命化計画	97.41	102.00	4.59 (104.7%)
公営住宅等長寿命化計画	65.00	64.36	▲0.64 (99.0%)
職員宿舎長寿命化計画	9.54	8.38	▲1.16 (87.8%)
県営水道長寿命化計画	171.70	158.83	▲12.87 (92.5%)
可茂工業用水道長寿命化計画	0.52	0.42	▲0.10 (80.8%)
木曽川右岸流域下水道ストック マネジメント計画等	215.13	214.63	▲0.50 (99.8%)

令和5年度に実施した主な長寿命化対策

計画名	主な対策（実績額：億円）
県有建物 長寿命化計画	【長寿命化】 下呂総合庁舎・非常用発電装置等改修工事（2.7）、岐阜県福祉・農業会館・空調設備・給排水衛生設備更新工事（4.0）、岐阜メモリアルセンター・水泳場、野球場、弓道場照明改修工事（3.1）、岐阜県警察本部・空調設備更新工事（空冷エアコン）（2.0）、土岐商業高等学校・産振校舎屋上・外壁・内部改修工事（2.3）、アクティブG・GHP室外機更新工事（2.7） 【ユニバーサルデザイン化】 バリアフリー化 8施設（0.4）、バリアフリースイールの設置・改修 5施設（※）、トイレの洋式化 6施設（0.7） ※他工事と併せて実施したものがあり、バリアフリースイールの設置・改修のみの実績額の算出は困難
都市公園 長寿命化計画	ぎふワールド・ローズガーデン 園内一円修繕工事（0.3）、養老公園 浄化槽改修工事（0.3）、ぎふ清流里山公園 トイレ改修設計（0.1）、各務原公園 舗装更新（0.1）
公営住宅等 長寿命化計画	県営尾崎住宅 屋上防水改修・給排水管等改修（1.4）、県営赤保木住宅 屋上防水改修（0.3）
職員宿舎 長寿命化計画	川島町アパートほか6棟・リフォーム（0.1）、白鳥第2教職員アパート・屋上防水工事（0.1）、益田第5教職員アパート・リフォーム（0.1）
県営水道 長寿命化計画	取水・送水ポンプ、水処理機械設備、送水管路等更新（17.5）、水管橋、送水管路等修繕（1.4）
可茂工業用水道 長寿命化計画	水道メーター更新工事（0.1）
木曽川右岸流域下 水道ストックマネ ジメント計画等	【処理場】 水処理（15・16池）散気装置（長寿命化）工事（0.5） 【管渠】 幹線管渠管更生工事（4.5）、マンホール防食対策工事（2.8）

参考（各長寿命化計画の予算措置状況・対策の進捗状況）

○以下の長寿命化計画について、対策の進捗状況の確認を行った。

○総じて、いずれの計画も目標に向けて進捗している。

計画名	指 標	進 捗 状 況		
道路施設 維持管理指針	定期点検において、「早期に措置を講ずべき状態」とされた橋梁に対し、対策を実施した割合	(目標)	令和6年度までに	100%
		(実績)	令和5年度末時点	91%
			(対前年度比 +5ポイント)	
河川インフラ 長寿命化計画	対策を実施した施設のうち、「機能に支障が生じていない」と評価した施設の割合	(目標)	毎年度	100%
		(実績)	令和5年度	100%
		(7施設中7施設が「機能に支障が生じていない」)		
砂防関係施設 長寿命化計画	「要対策」と評価した砂防施設に対し補修等の対策を実施した割合	(目標)	令和6年度までに	100%
		(実績)	令和5年度末時点	100%
			(対前年度比 +14ポイント)	
治山施設 長寿命化計画	「緊急に修繕が必要」又は「計画的な修繕が必要」と評価した治山施設に対し補修等の対策を実施した割合	(目標)	令和7年度までに	100%
		(実績)	令和5年度末時点	78%
			(対前年度比 +25ポイント)	

令和５年度に実施した主な長寿命化対策

計画名	主な対策（実績額：億円）
道路施設 維持管理指針	【橋梁修繕】 ・ 長良大橋（岐阜市）（0.5） ・ 新長瀬橋（美濃市）（0.4） ・ 岩瀬橋（高山市）（0.1）
河川インフラ 長寿命化計画	・ 中野方ダム（恵那市）受変電設備・観測設備更新（1.8） ・ 山田川排水機場（岐阜市）電気盤更新（0.3） ・ 桑原川浄化施設（羽島市）送風機更新（0.3）
砂防施設 長寿命化計画	【砂防施設の補修等】 ・ 粕川（揖斐川町）（0.5） ・ 竹原川（下呂市）（0.1） ・ 新の谷（大垣市）（0.1）
治山施設 長寿命化計画	【治山施設の補修等】 ・ 一疋洞（白川村）（0.2） ・ 長洞（関市）（0.2） ・ 籠林（下呂市）（0.1）
