


※施工時期は資料作成時点の見込みであり、工事の進捗状況により変更の可能性があります。

赤坂大橋仮設道路工事に伴う 交通切り回しについて

令和5年1月

岐阜県大垣土木事務所

■ 工事の順序

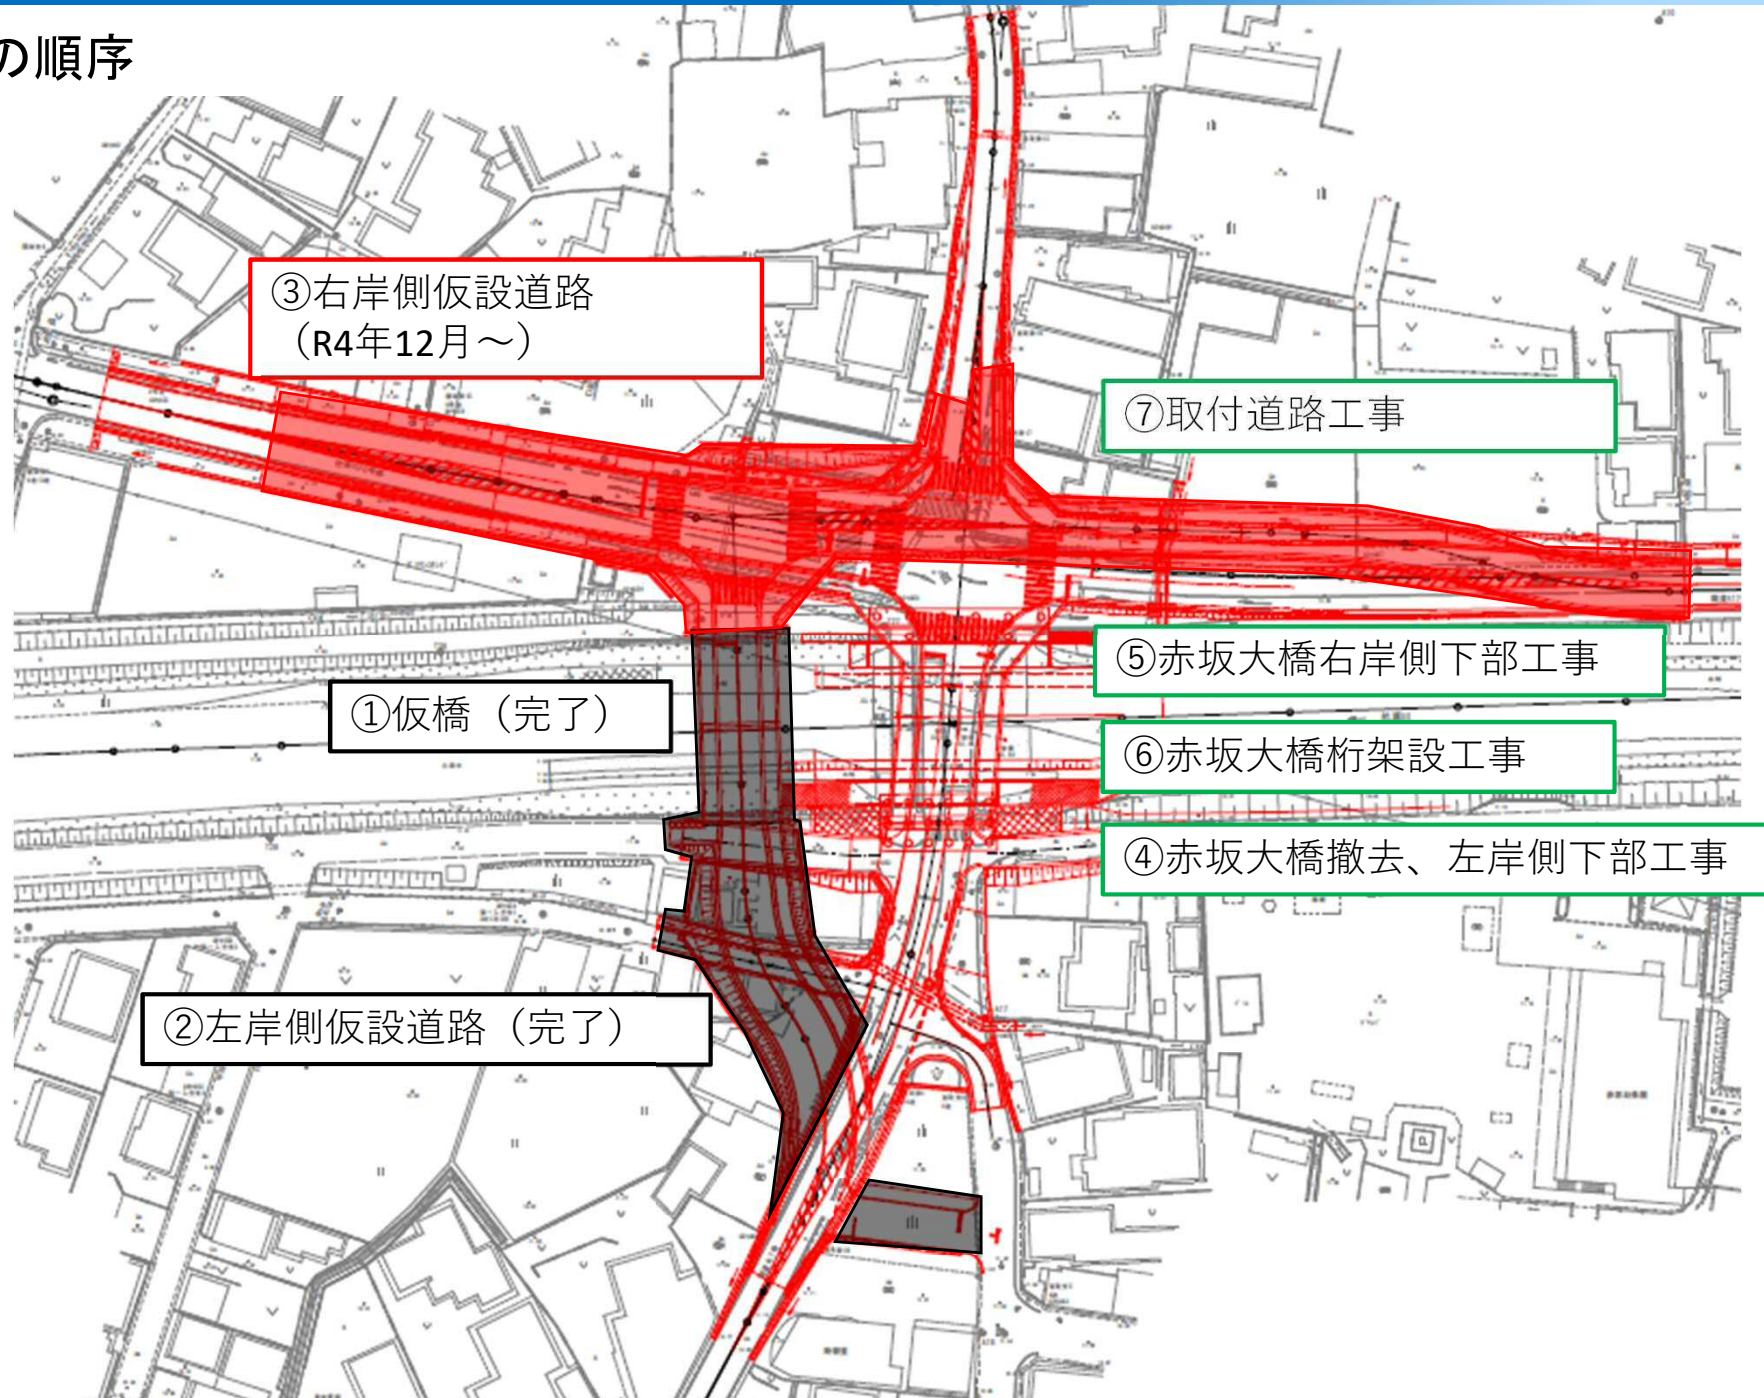

赤坂大橋架け替え工事の進め方

赤坂大橋架け替え工事の全体スケジュール

①仮橋工事

完了

②左岸側仮設道路工事

完了

③右岸側仮設道路工事

令和4年12月1日～

④赤坂大橋撤去 + 左岸側下部工事


⑤赤坂大橋右岸側下部工事

⑥赤坂大橋桁架設工事

⑦取付道路工事

具体的な内容について、
説明します。



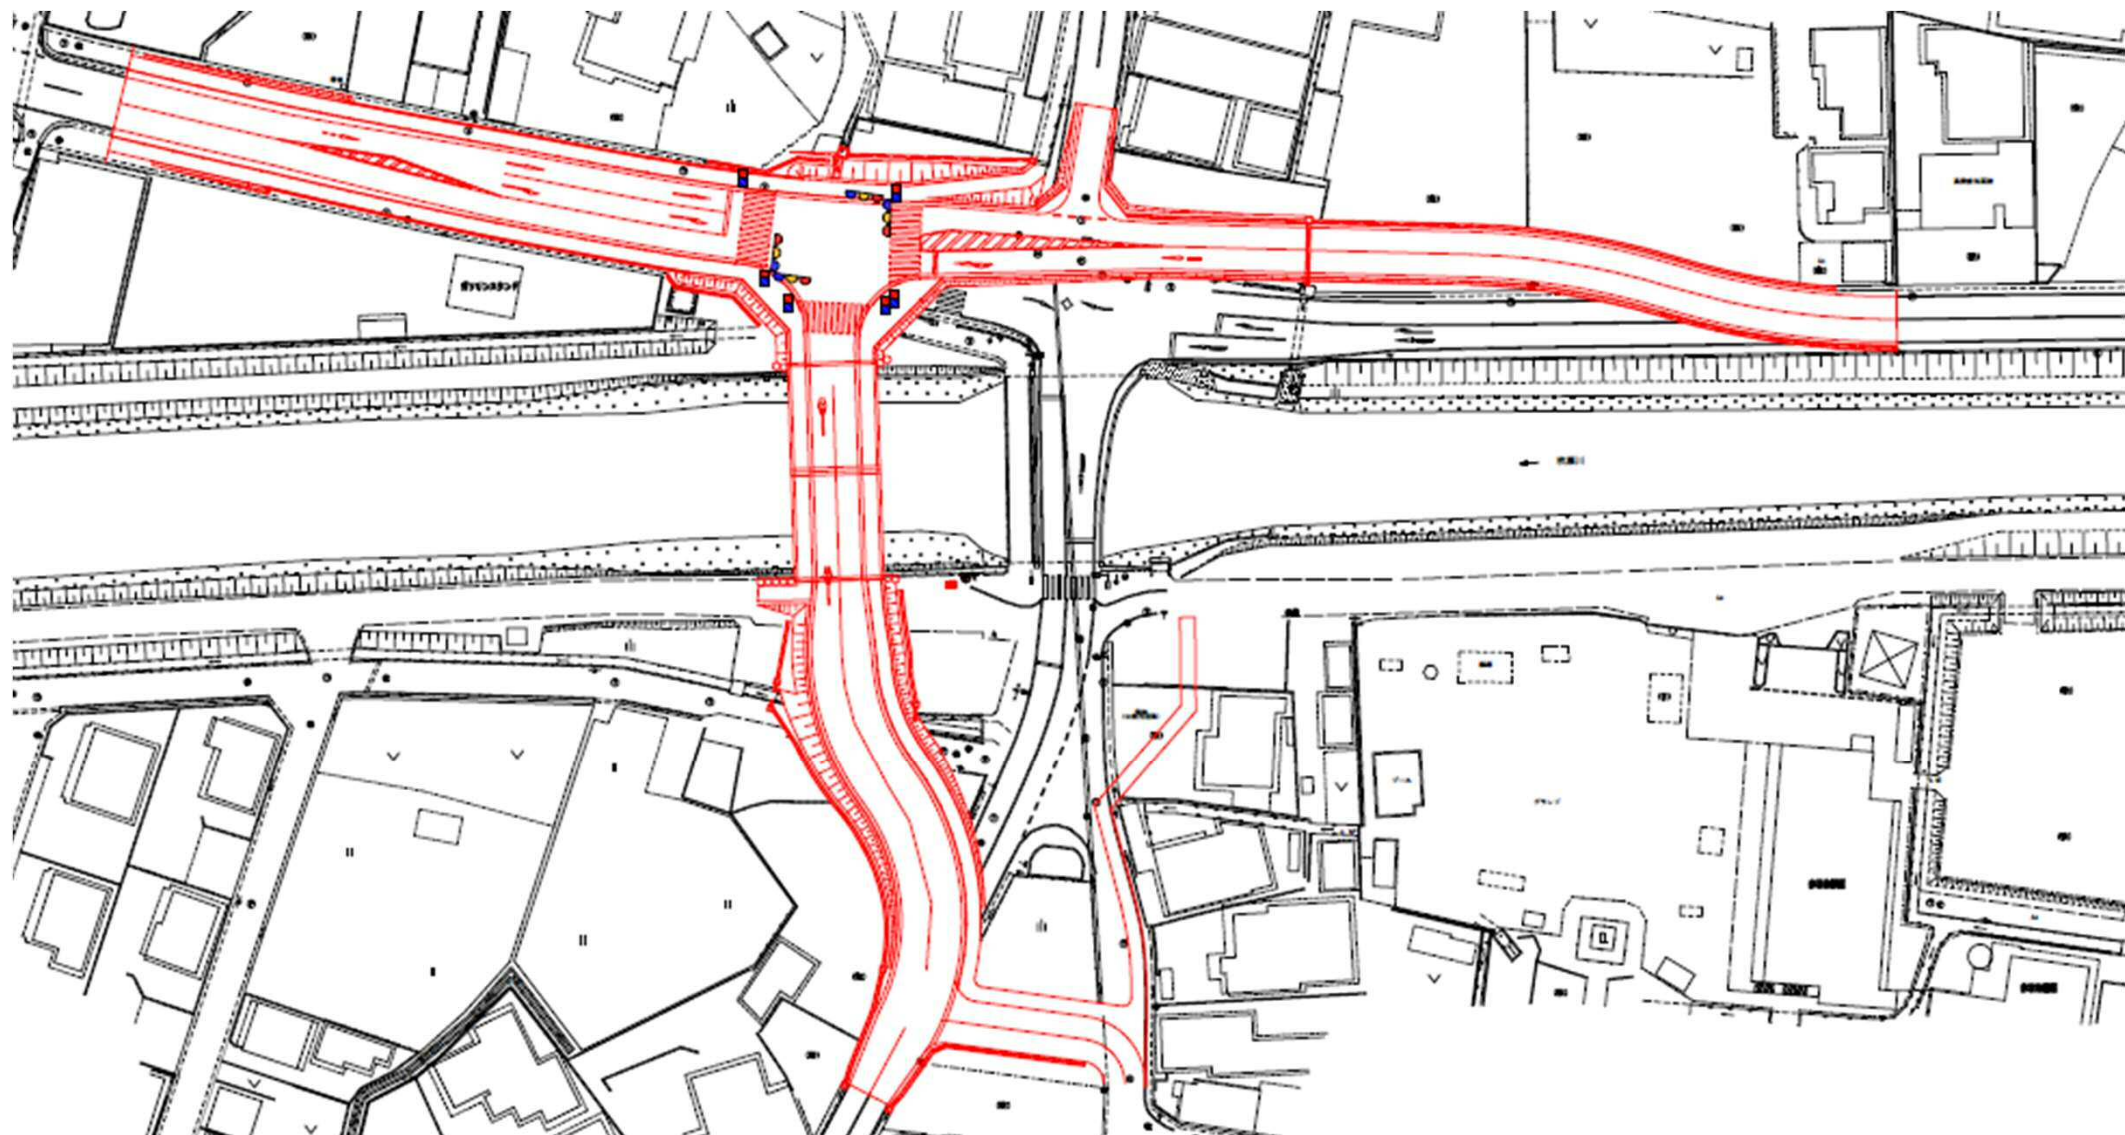

施工ステップについて

原則、車両や歩行者の通行を確保しながら施工します。
そのため、いっぺんに施工するのではなく、施工範囲を区切りながら施工します。

(以下、施工範囲を区切ることを施工ステップと呼びます)

施工ステップは1～13段階となります。


それぞれの施工ステップで『車両や歩行者の通行経路』『施工内容』『施工期間』について、1ステップずつ説明します。

施工時期：12月初旬～1月初旬

施工場所：赤坂大橋西交差点の北側（道路外）


施工内容：道路盛土工、舗装工、側溝工、防護柵工

基本的には交通規制は発生しません。（但し、道路際の側溝を施工する際に一時的に片側交互通行になる可能性があります。）

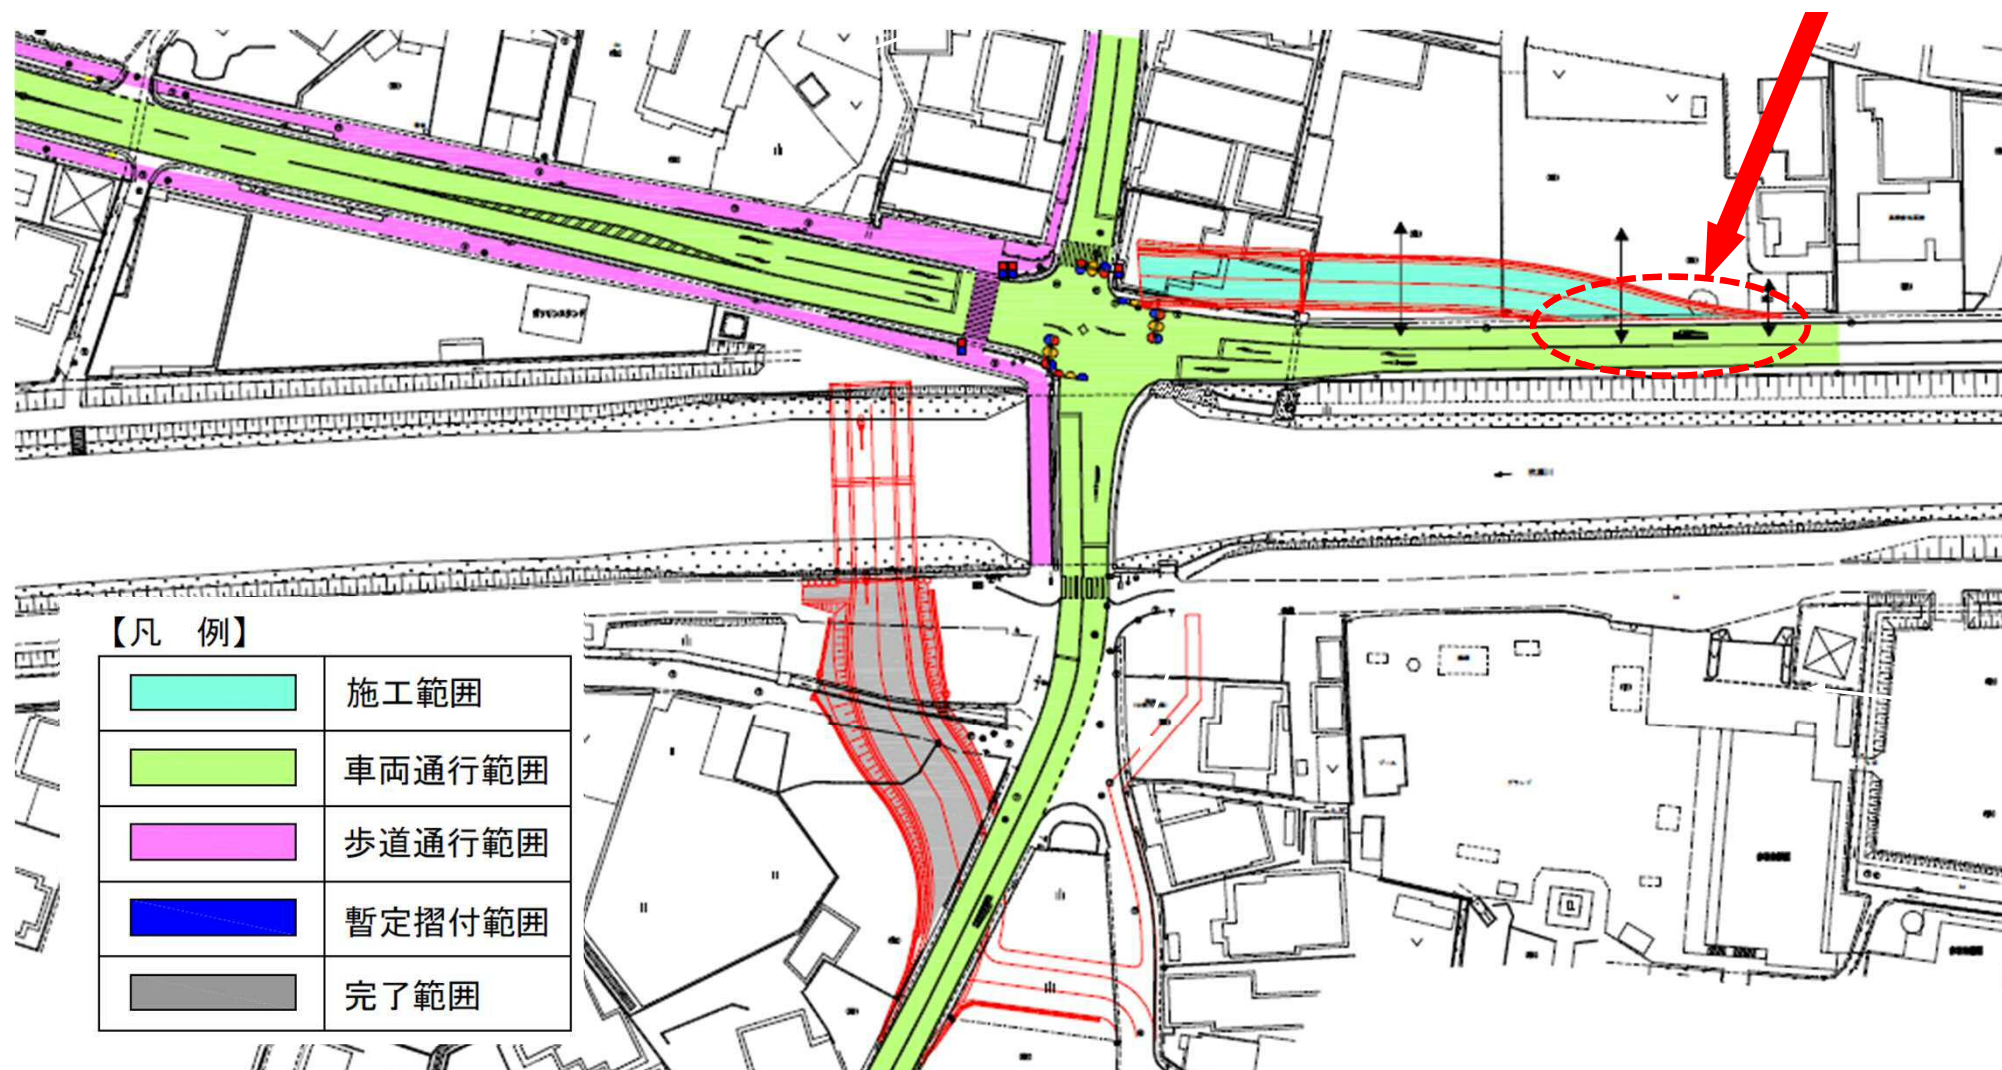

施工時期：1月初旬～1月下旬
施工場所：赤坂大橋西交差点南の東側歩道
施工内容：舗装工

東側歩道は、杭瀬川への堤防上へ迂回となります。(現況歩道と堤防との接続部は、舗装等のすりつけを行います。)

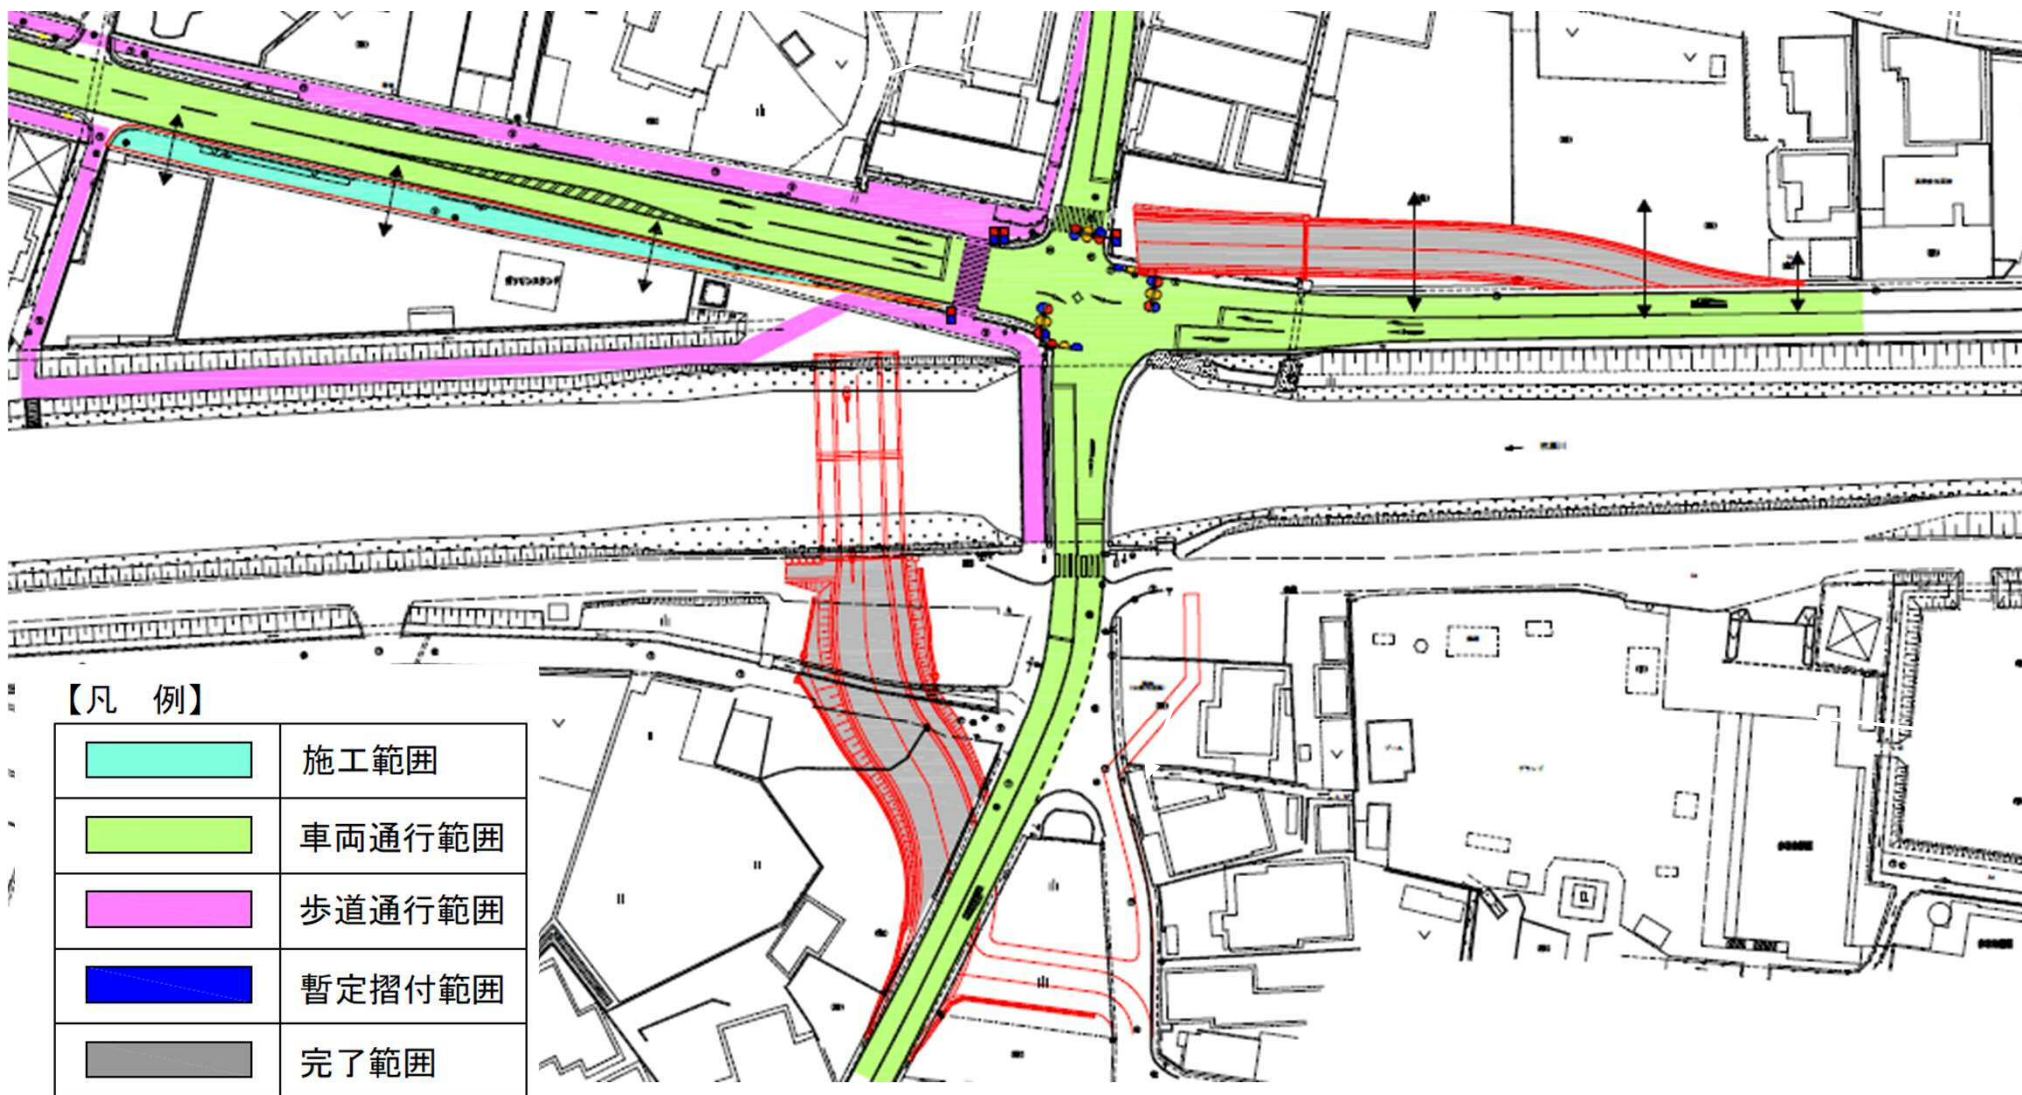


ステップ3

施工時期：2月初旬

施工場所：赤坂大橋西交差点南側の車道

施工内容：区画線の設置

赤坂大橋西交差点より南側車道は、右折レーンが無くなり、通行範囲が若干川側へ移動します。

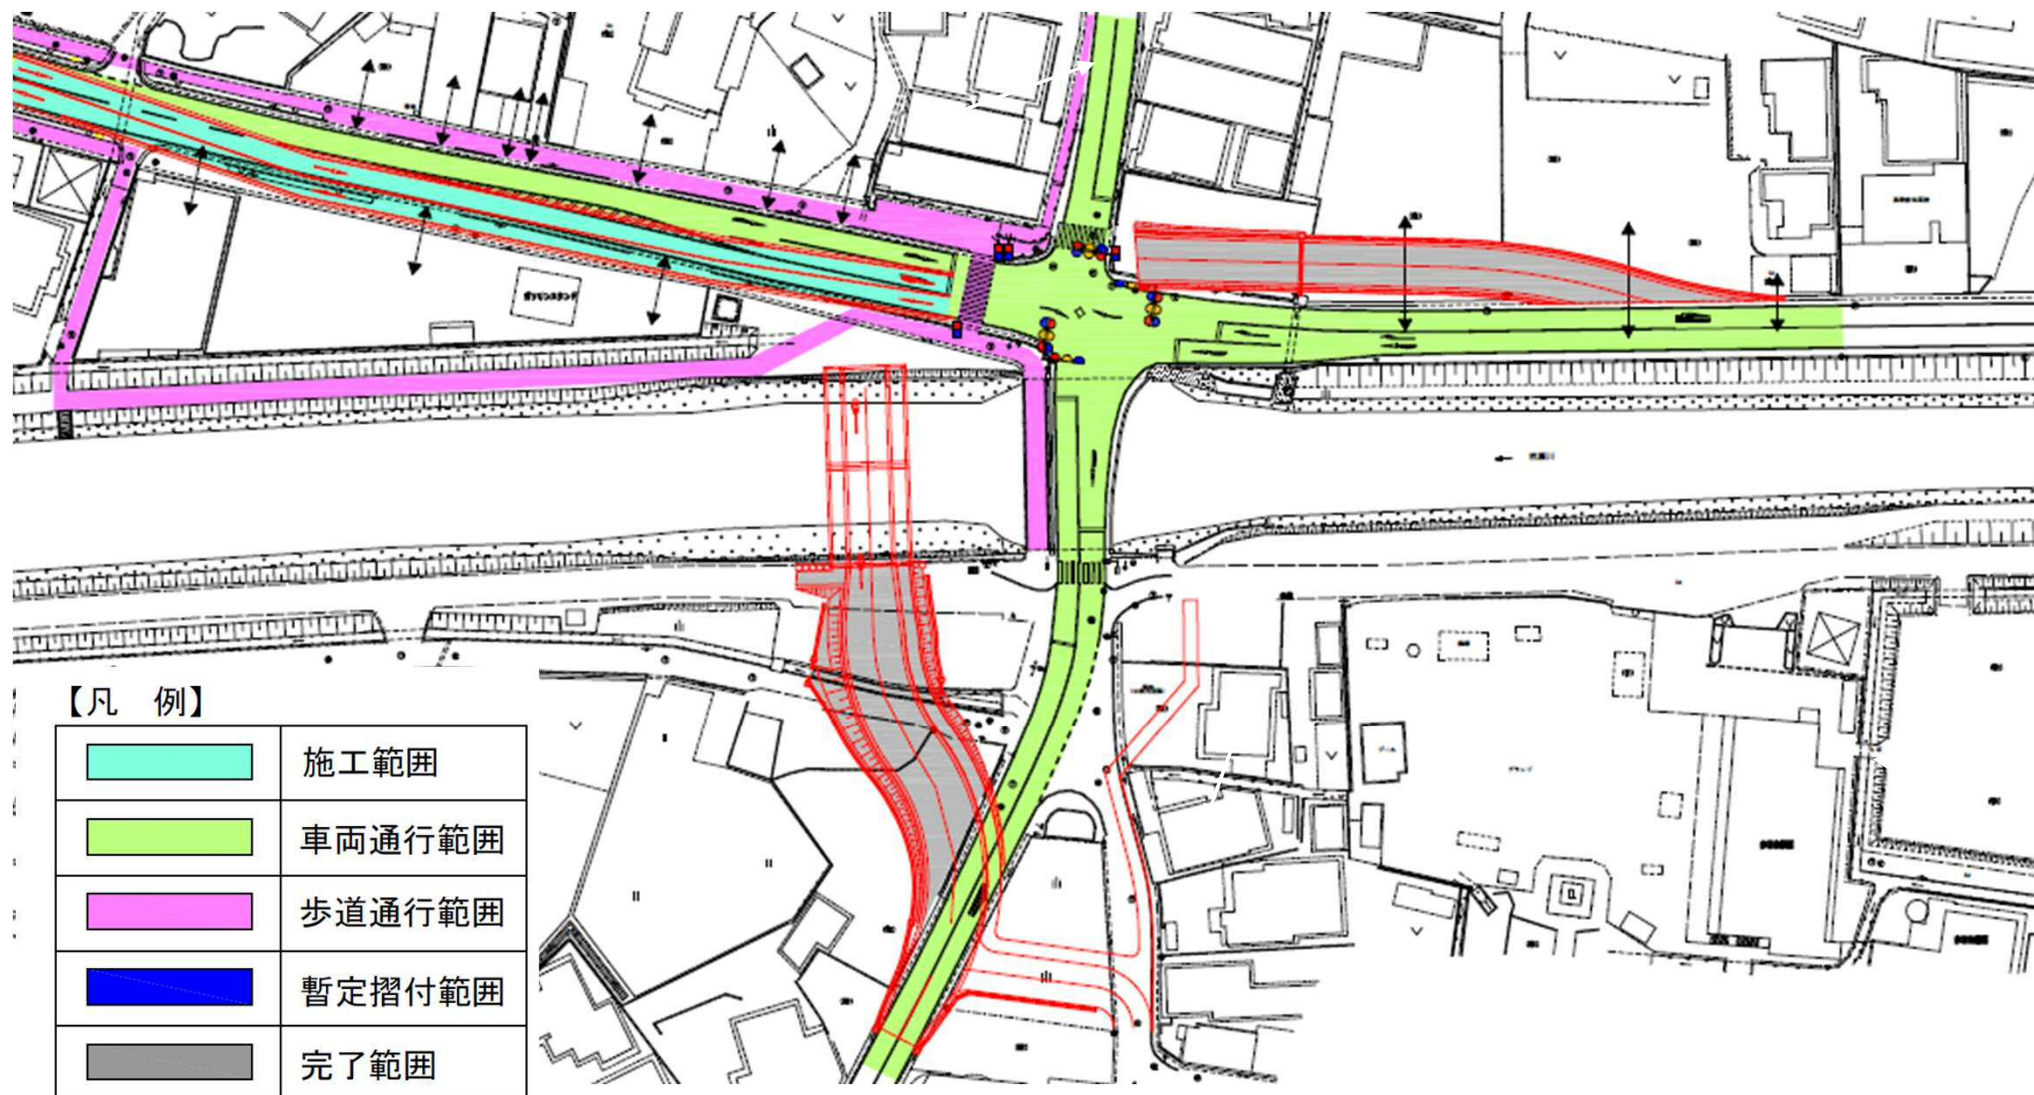


ステップ4

施工時期：2月初旬～3月下旬

施工場所：赤坂大橋西交差点南西側の車道及び歩道

施工内容：道路盛土工、舗装工、側溝工、防護柵工

赤坂大橋西交差点より南側車道は、右折レーンが無くなり、通行範囲が若干川側へ移動します。
西側歩道の位置が、若干移動します。

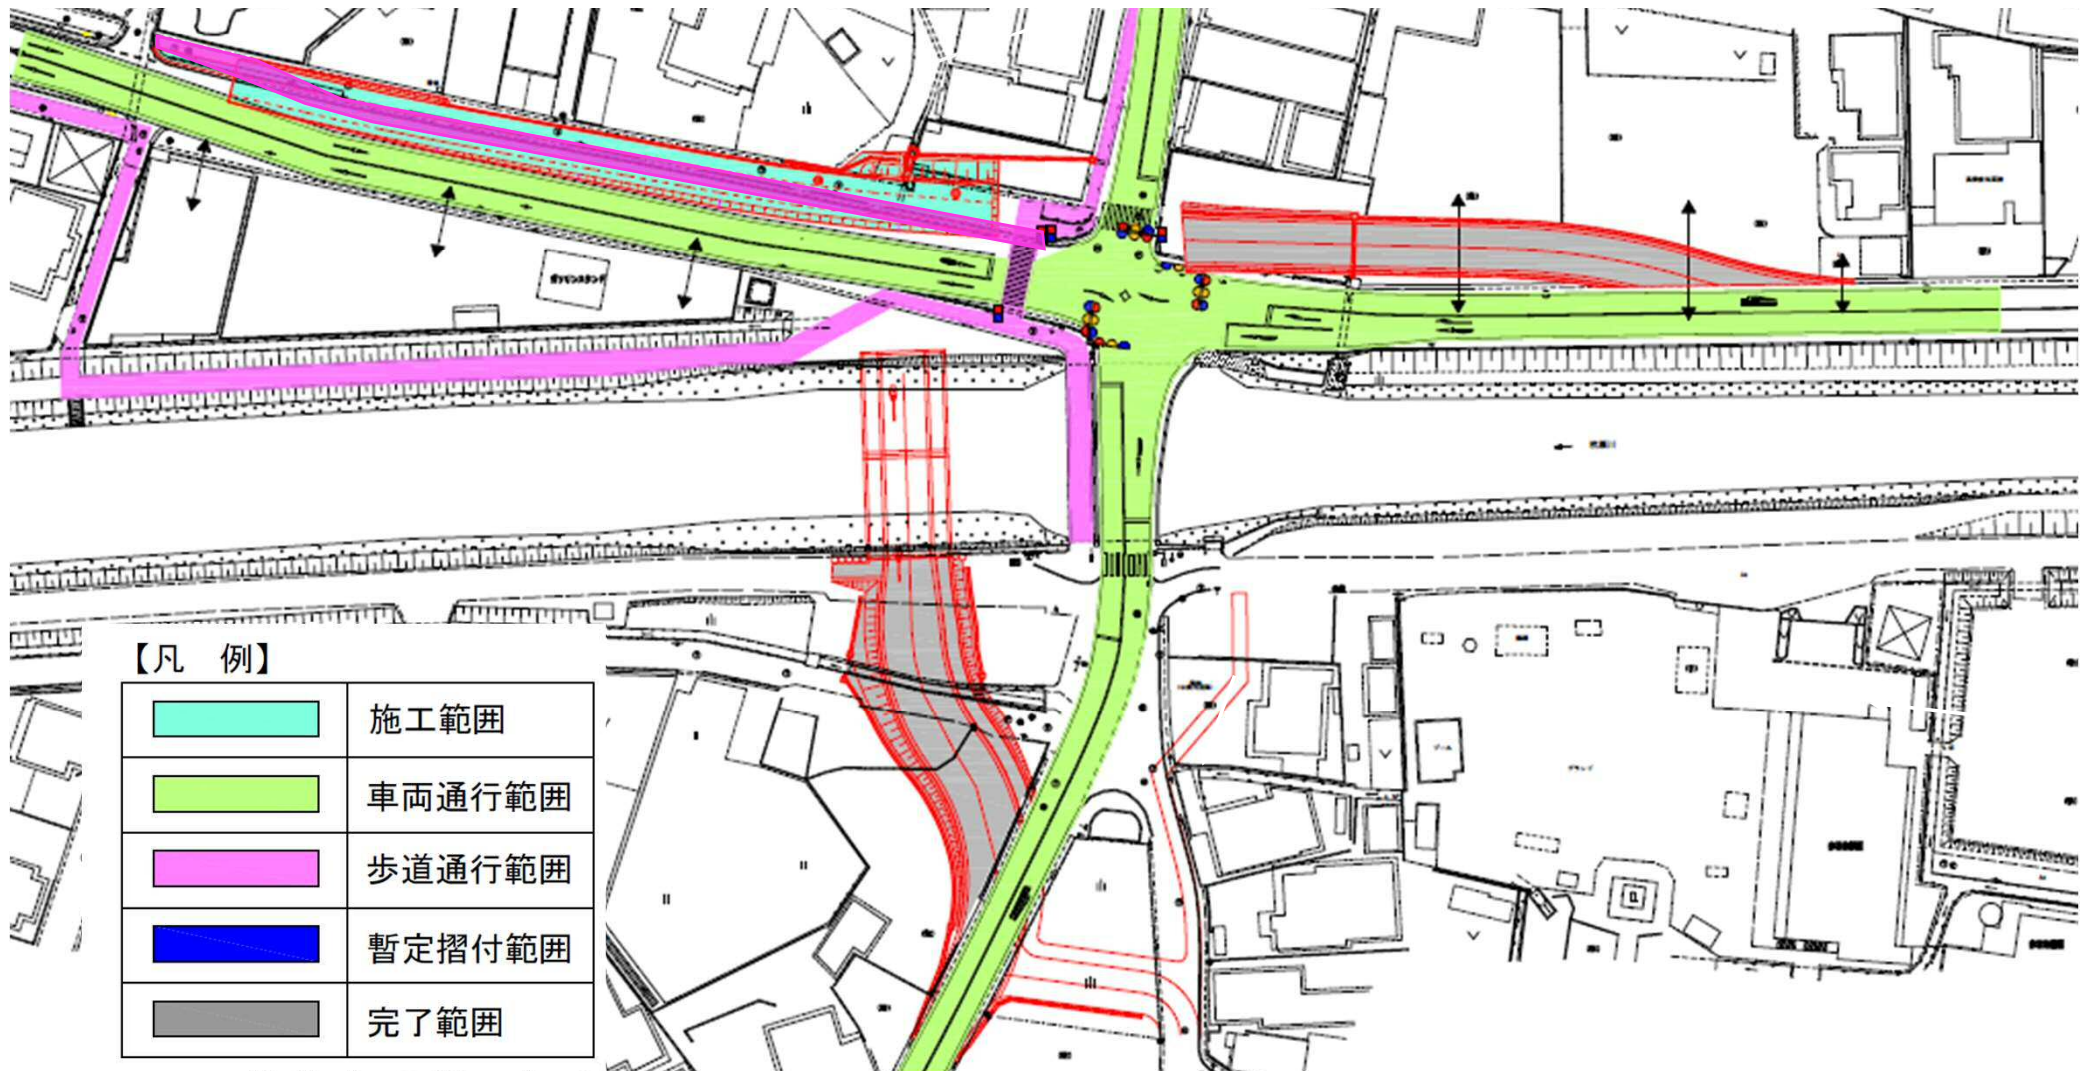


ステップ5

施工時期：4月上旬～4月中旬

施工場所：赤坂大橋西交差点西側の車道及び歩道

施工内容：道路盛土工、舗装工、側溝工、防護柵工

国道417号及び南側市道から赤坂垂井線への車両の行き来が出来なくなります。歩行者は通行可能です。交差点北側の右折レーンは無くなります。

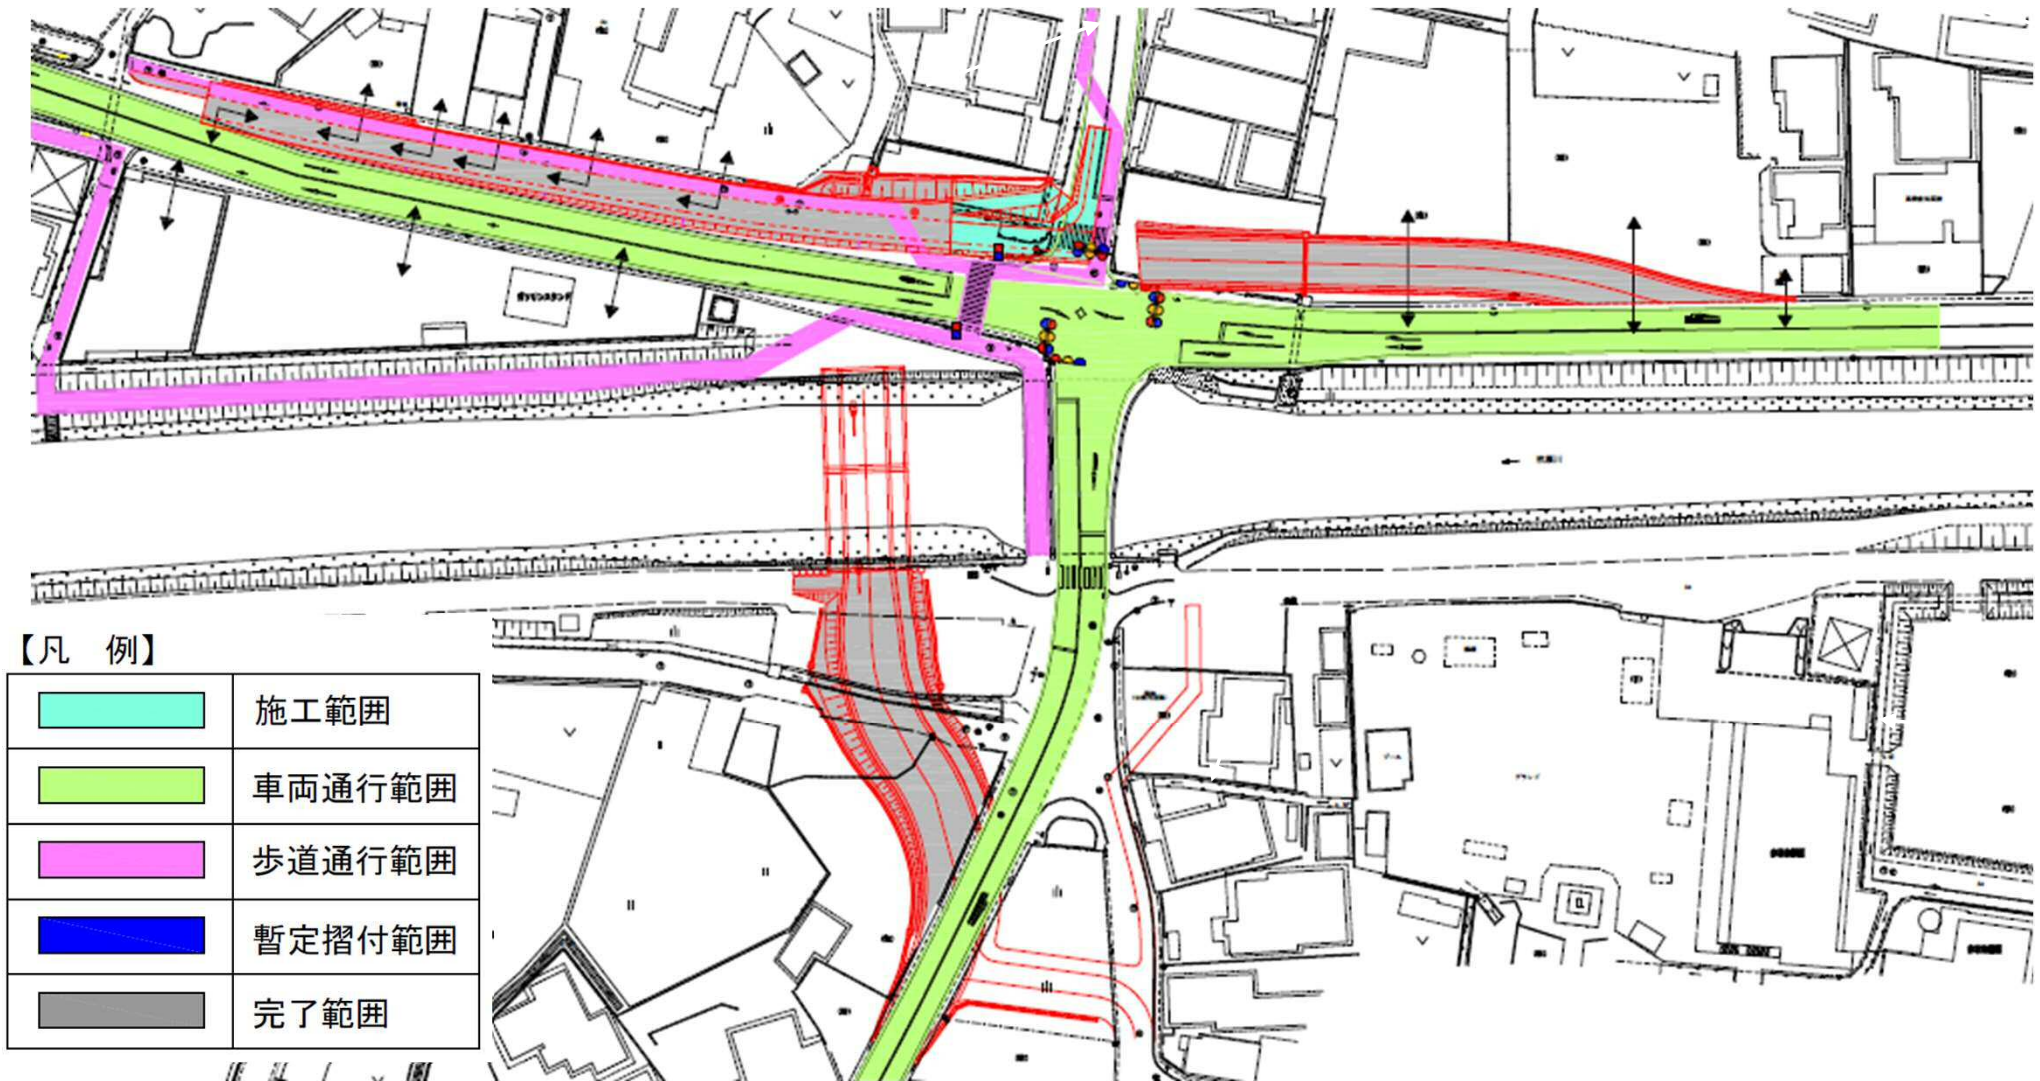


ステップ6

施工時期：4月中旬～5月上旬

施工場所：赤坂大橋西交差点西側の車道

施工内容：道路盛土工、舗装工、側溝工、防護柵工

国道417号及び南側市道から赤坂垂井線への車両の行き来が出来なくなります。歩行者は通行可能です。交差点北側の右折レーンは無くなります。

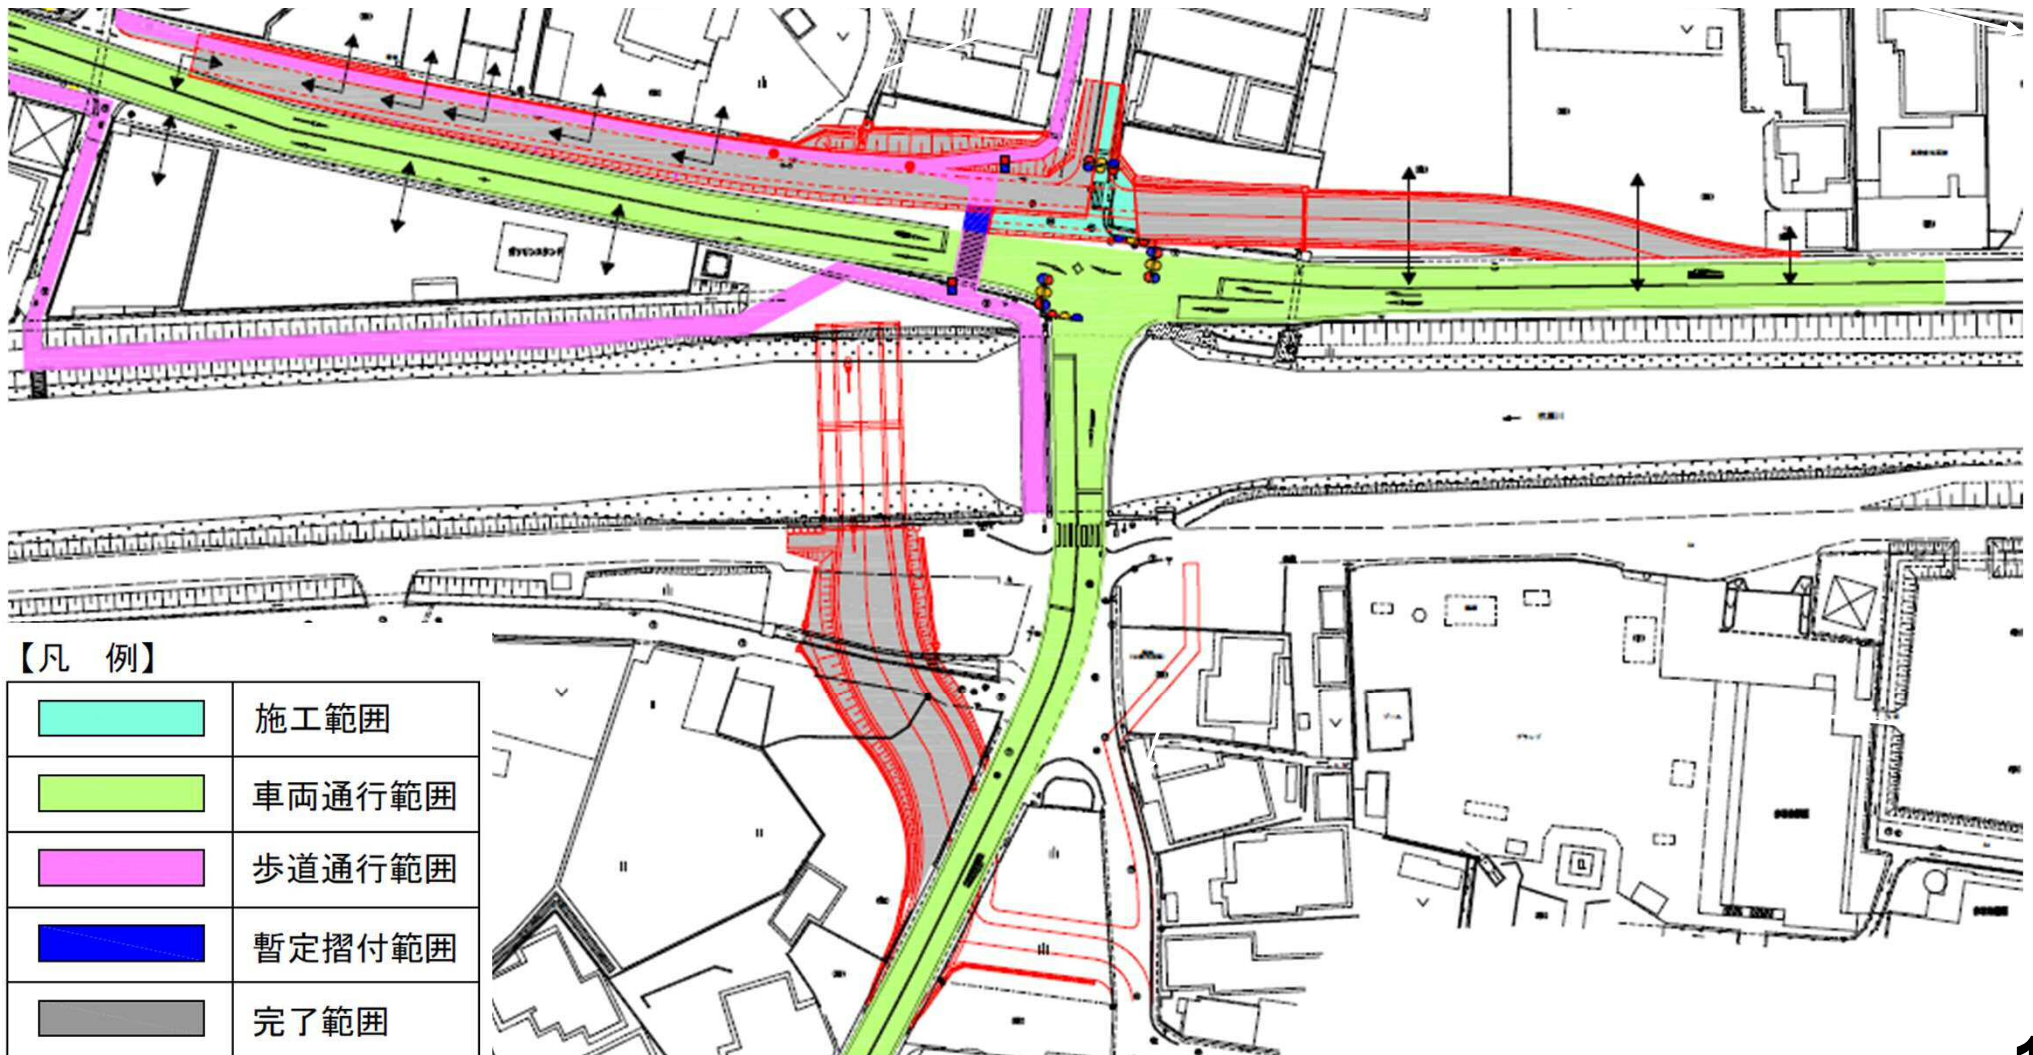


ステップ7

施工時期：5月上旬

施工場所：赤坂大橋西交差点南側の車道、北側の車道


施工内容：道路盛土工、舗装工、防護柵工、擦り付け舗装工、区画線工

国道417号及び南側市道から赤坂垂井線への車両の行き来が出来なくなります。歩行者は通行可能です。交差点北側の右折レーンは無くなります。

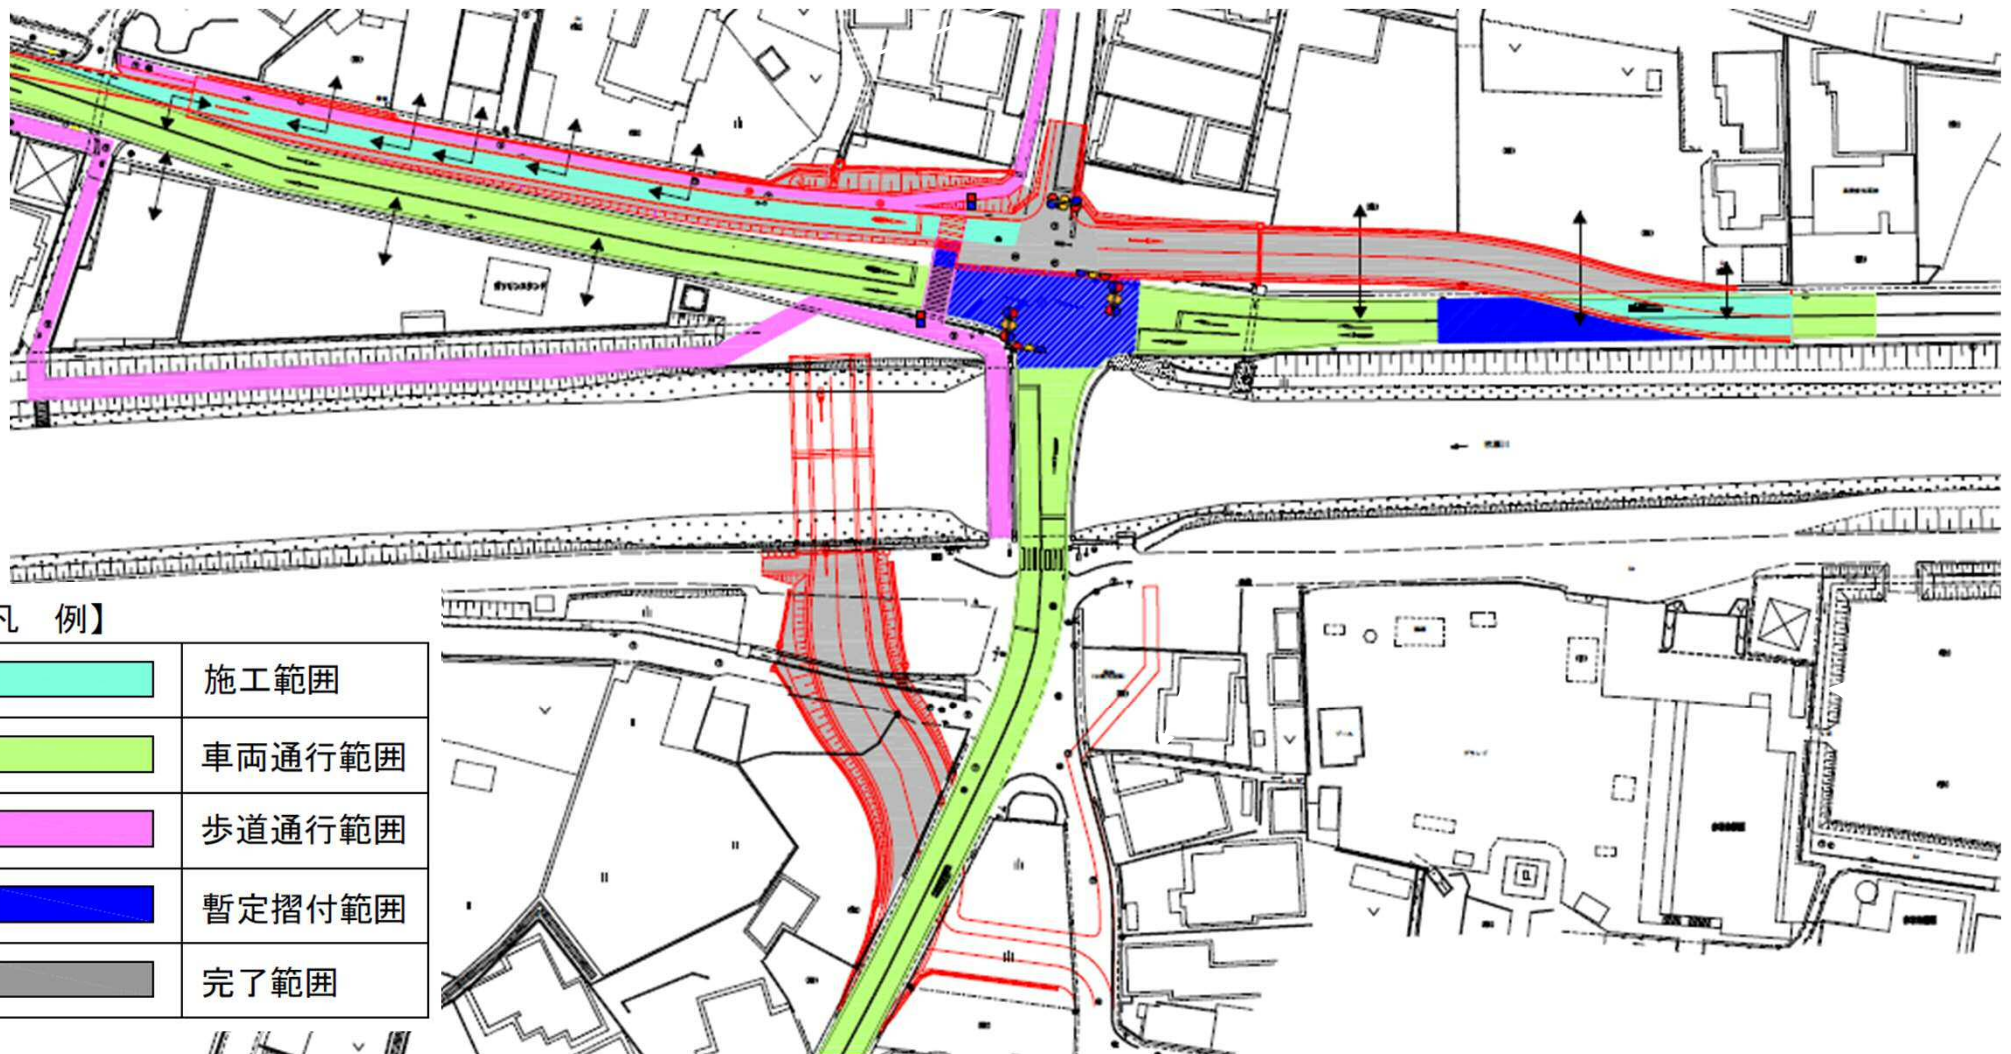

施工時期：5月上旬～5月下旬
施工場所：赤坂大橋西交差点南側の車道
施工内容：道路盛土工、舗装工

国道417号及び南側市道の車線が、北行きと南行きに分離されます。沿道からの車線をまたいだ通行は出来ません。(敷地から右折して本線への進入のことです。)
両方向とも、右折レーンはありません。

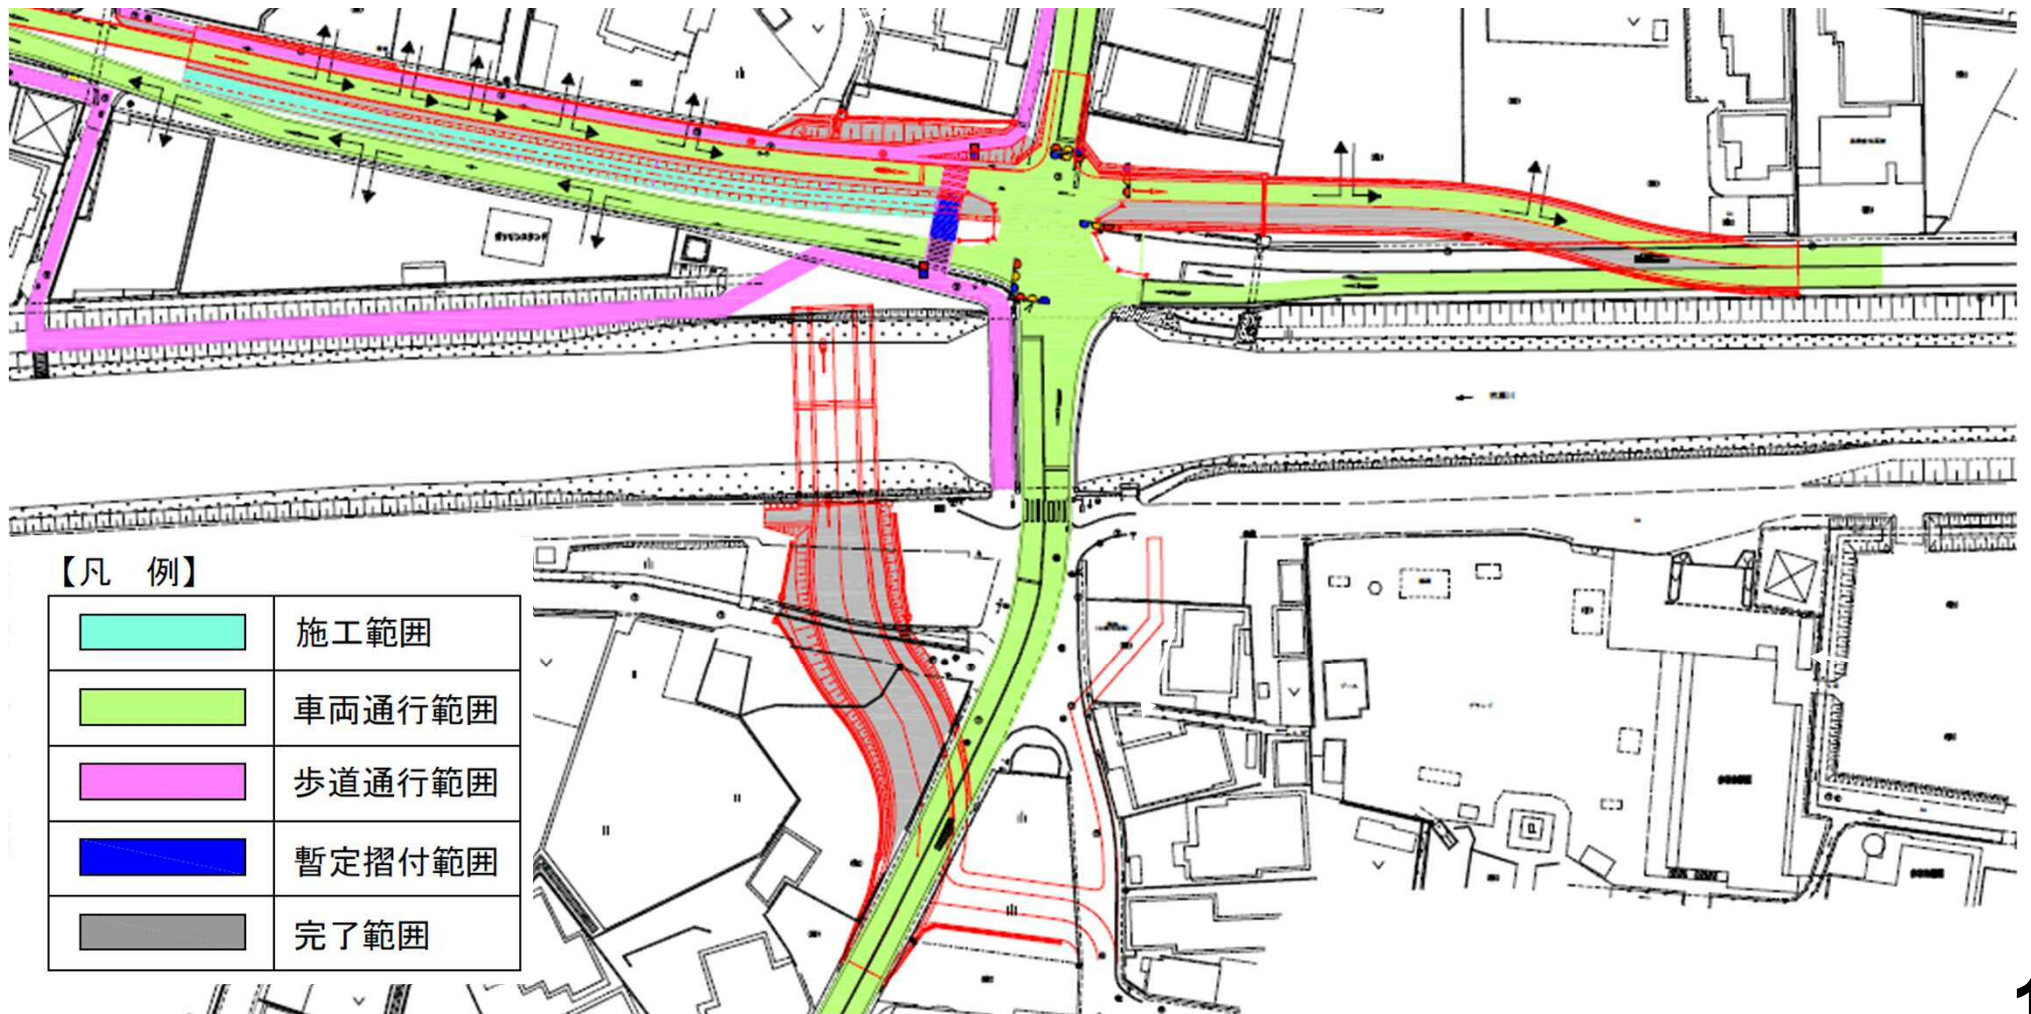


施工時期：5月下旬

施工場所：赤坂大橋西交差点南側の車道

施工内容：区画線工

国道417号及び南側市道の車線が、北行きと南行きに分離されます。沿道からの車線をまたいだ通行は出来ません。(敷地から右折して本線への進入のことです。)

両方向とも、右折レーンはありません。

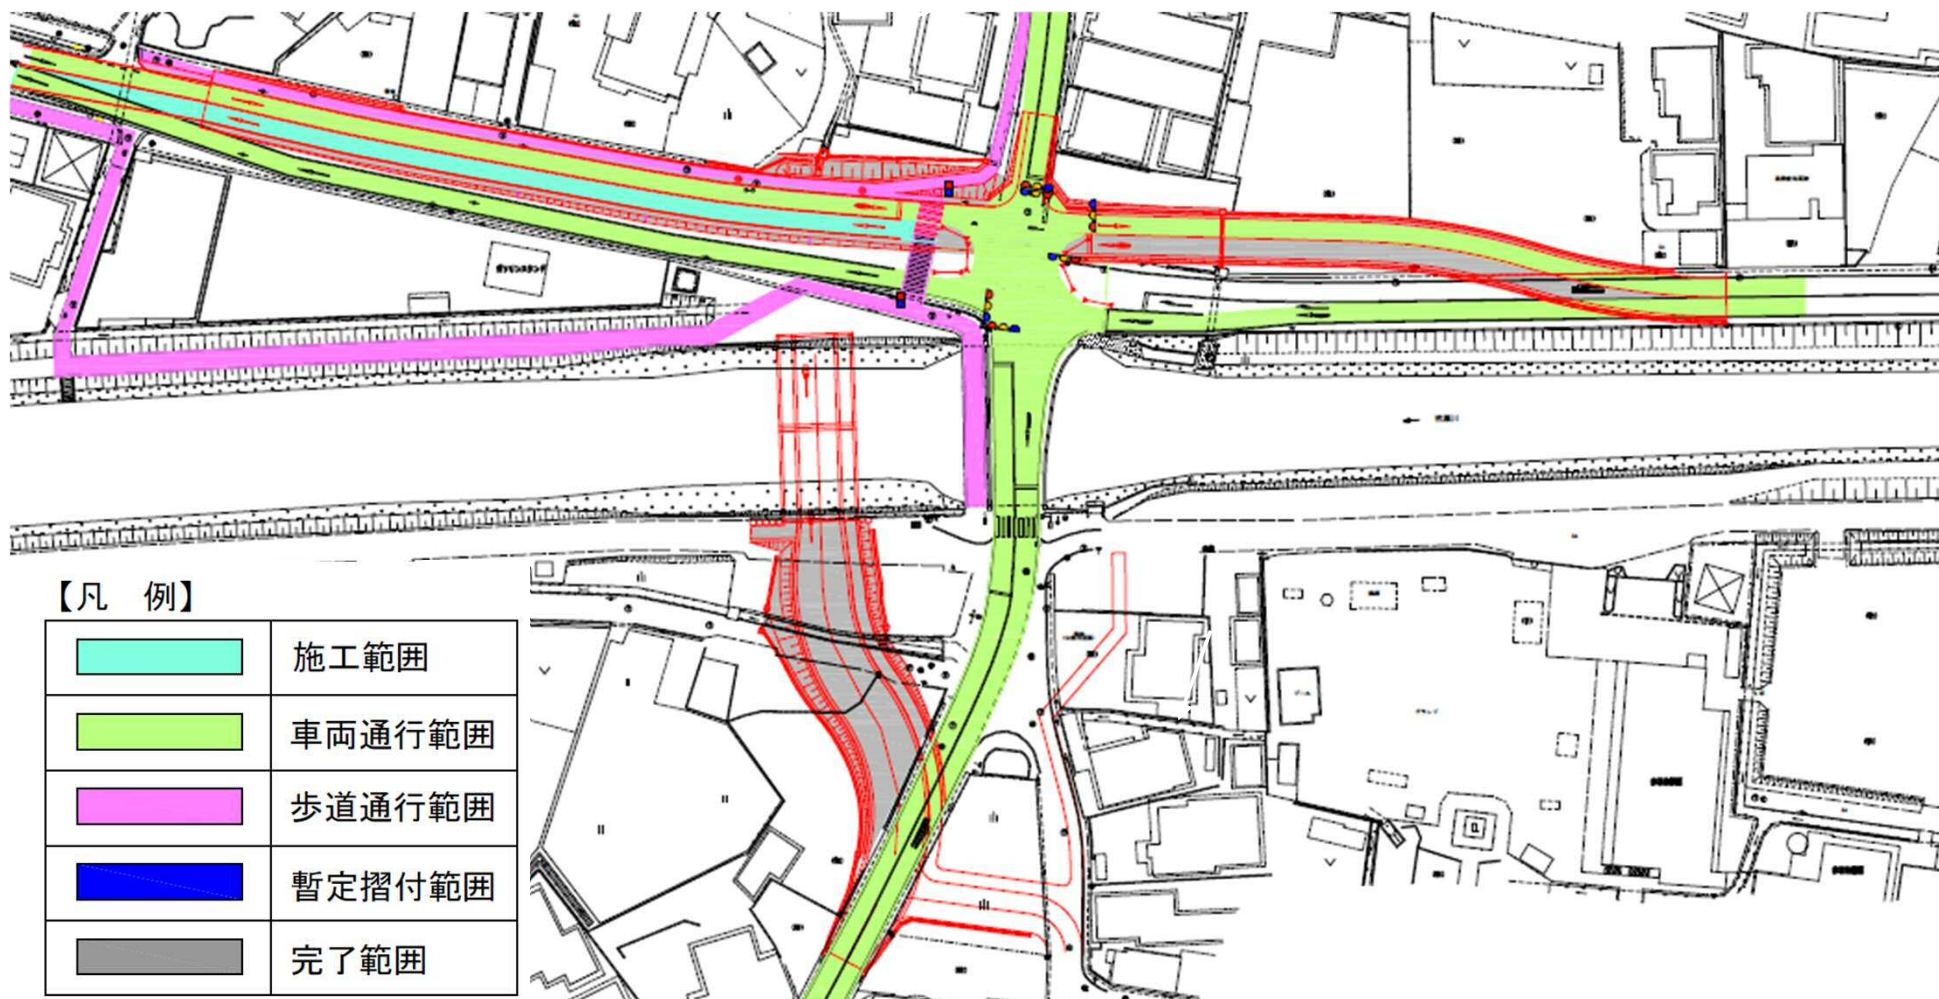


施工時期：6月上旬～7月中旬

施工場所：赤坂大橋西交差点南側の車道及び歩道

施工内容：道路盛土工、舗装工、防護柵工、区画線工

国道417号及び南側市道の車線が、北行きと南行きとも、西側に移動します。
両方向とも、右折レーンはありません。

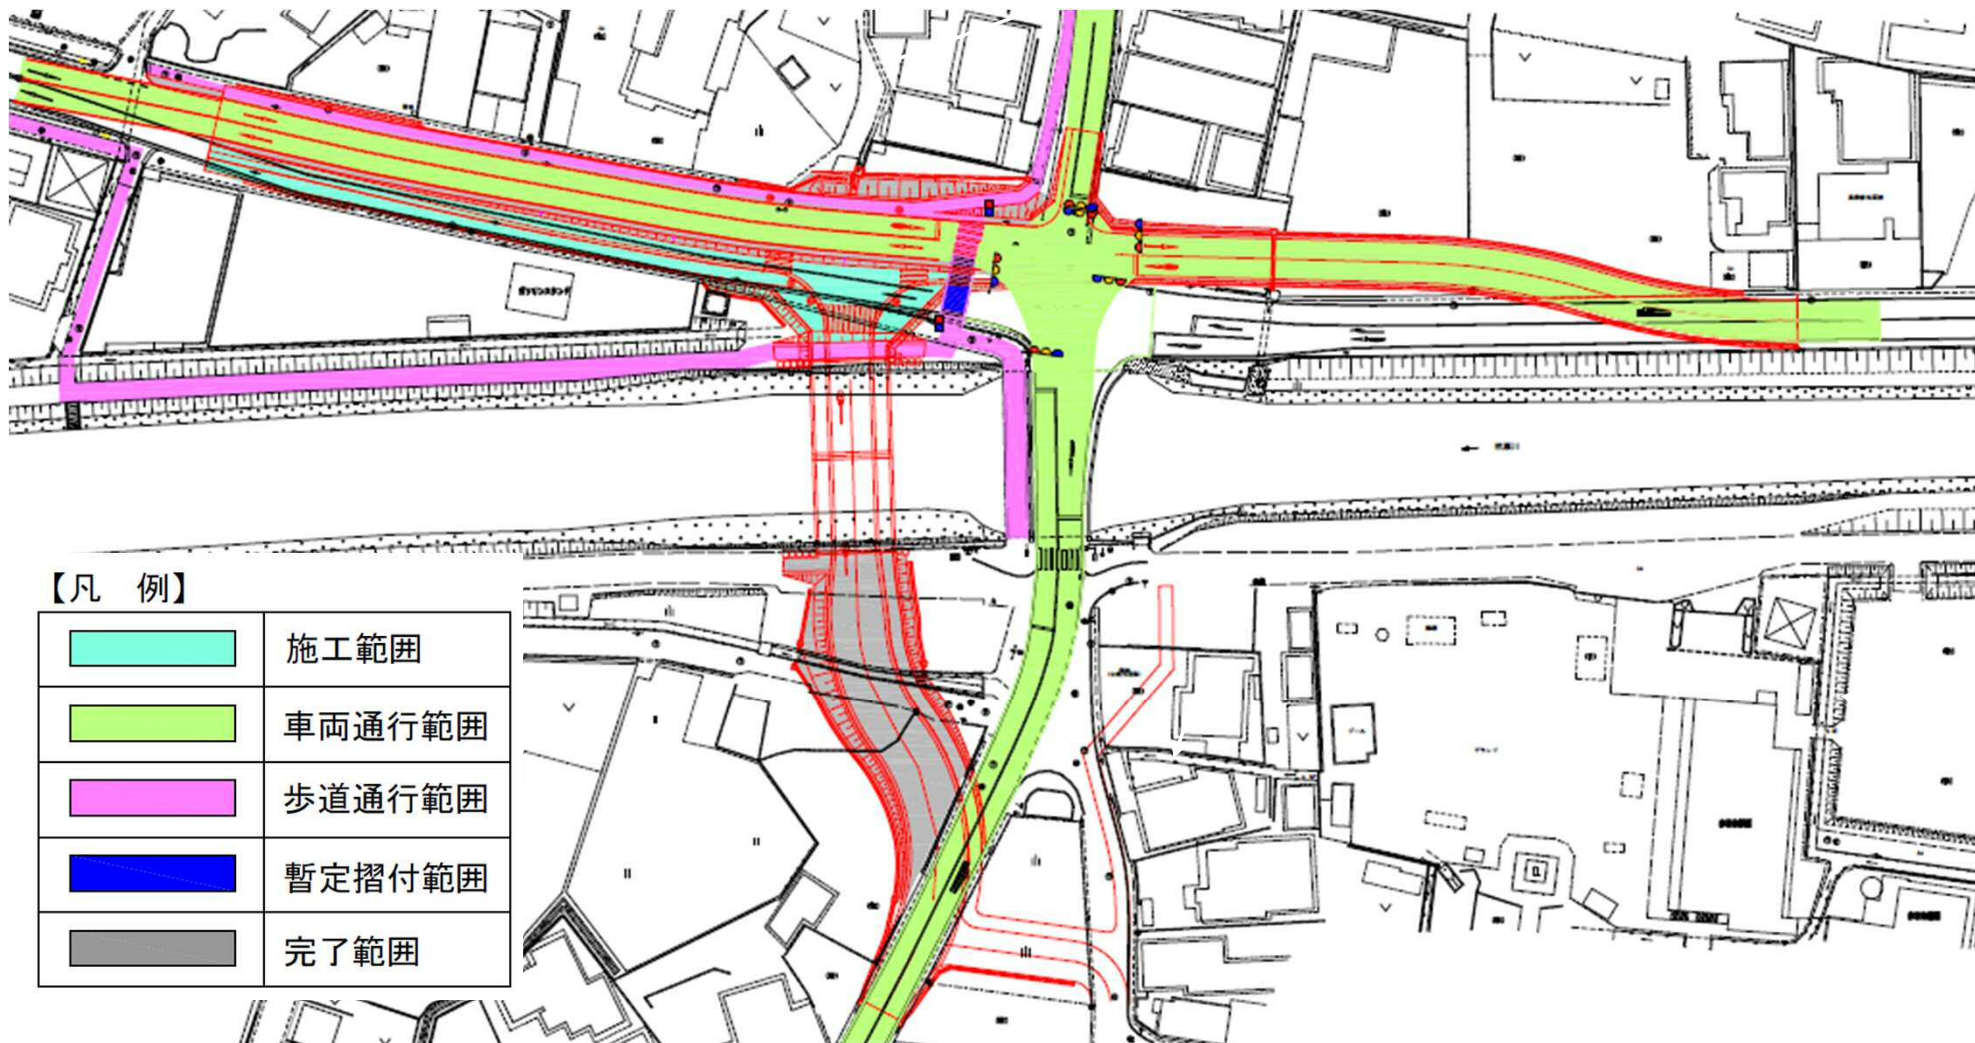


ステップ11

施工時期：7月中旬～8月上旬

施工場所：赤坂大橋西交差点東側の車道、仮橋

施工内容：道路盛土工、舗装工、防護柵工、区画線工

国道417号及び南側市道の車線が、北行きと南行きとも、西側に移動します。
両方向とも、右折レーンはありません。

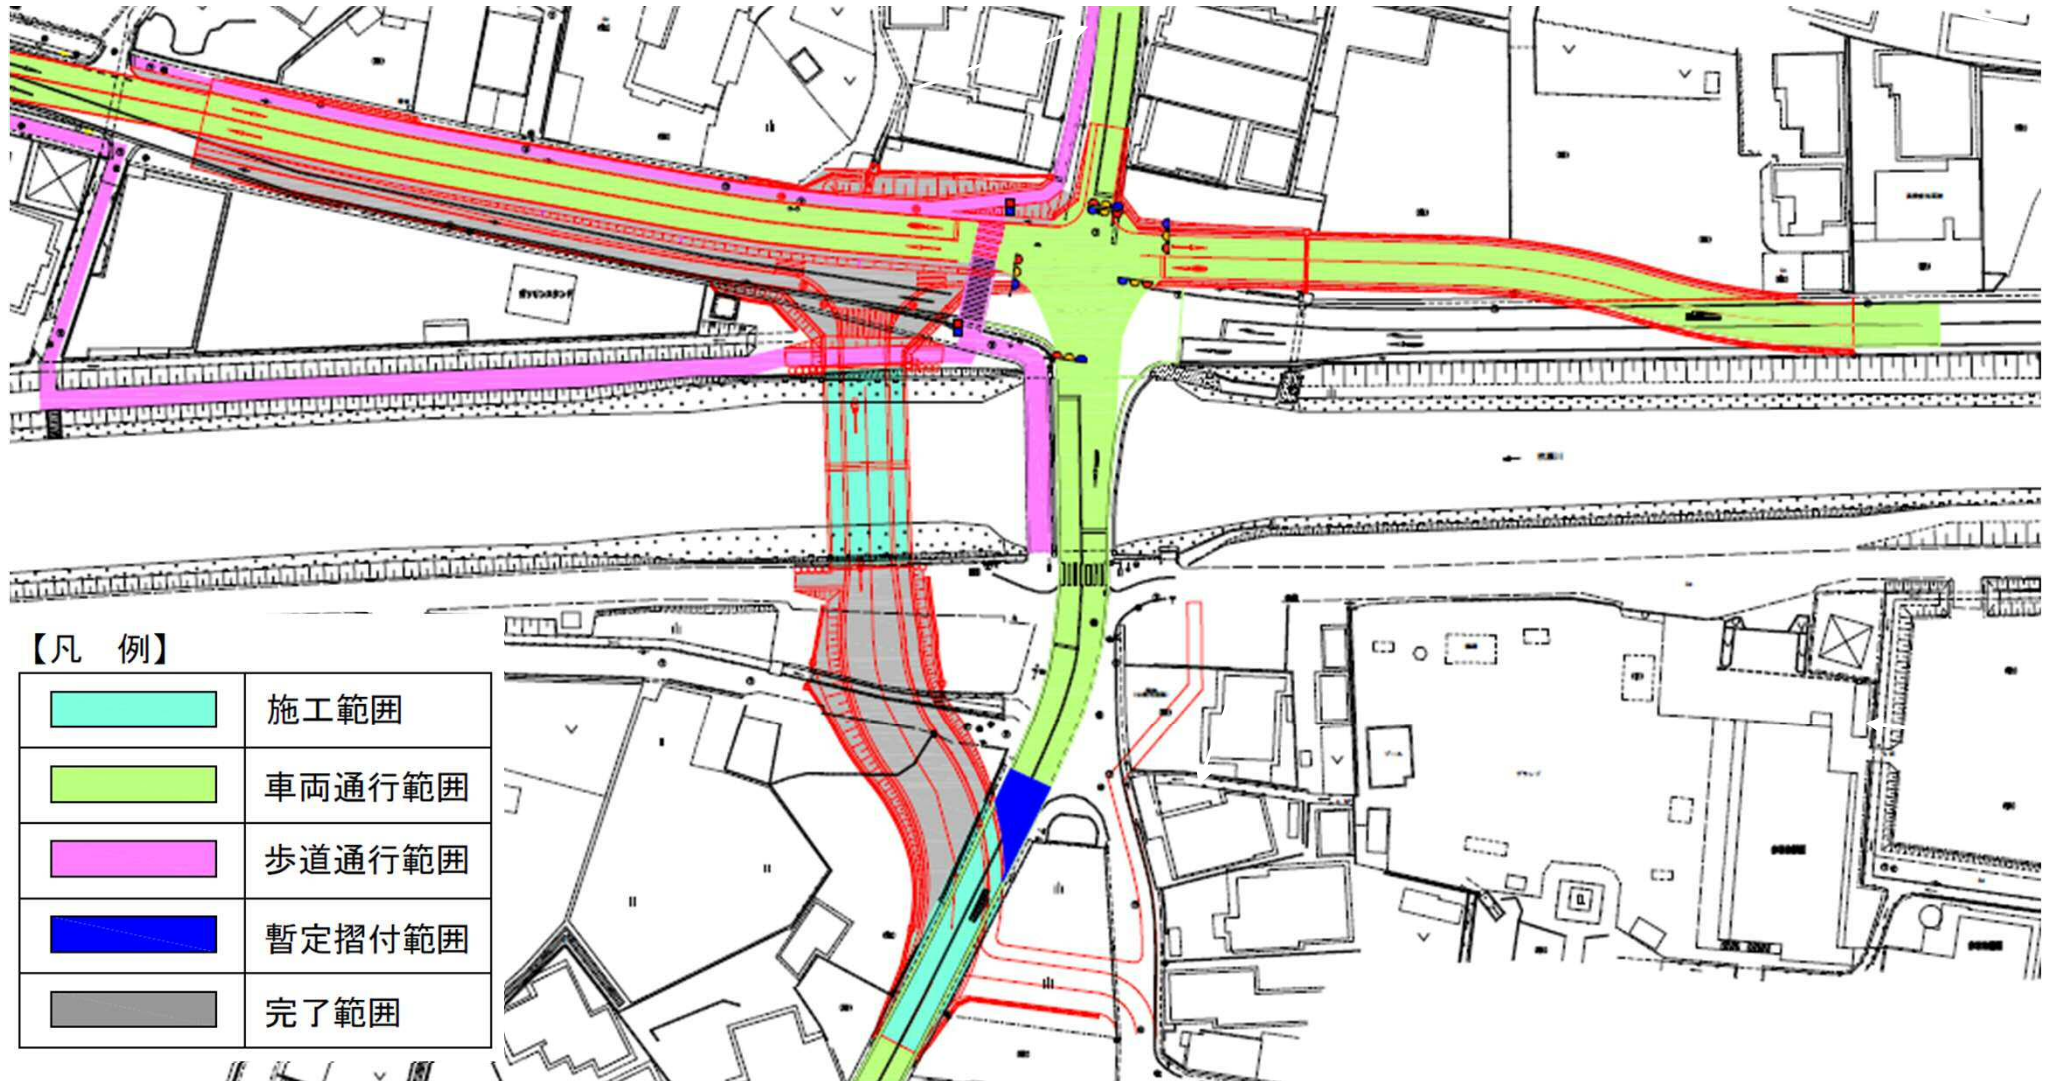


施工時期：8月上旬～9月上旬

施工場所：仮橋西交差点（仮設道路完成後の交差点）、赤坂大橋西交差点、

施工内容：仮設道路完成後の交差点の信号機施工、現赤坂大橋交差点の信号機撤去


国道417号及び南側市道の車線が、北行きと南行きとも、西側に移動します。
両方向とも、右折レーンはありません。

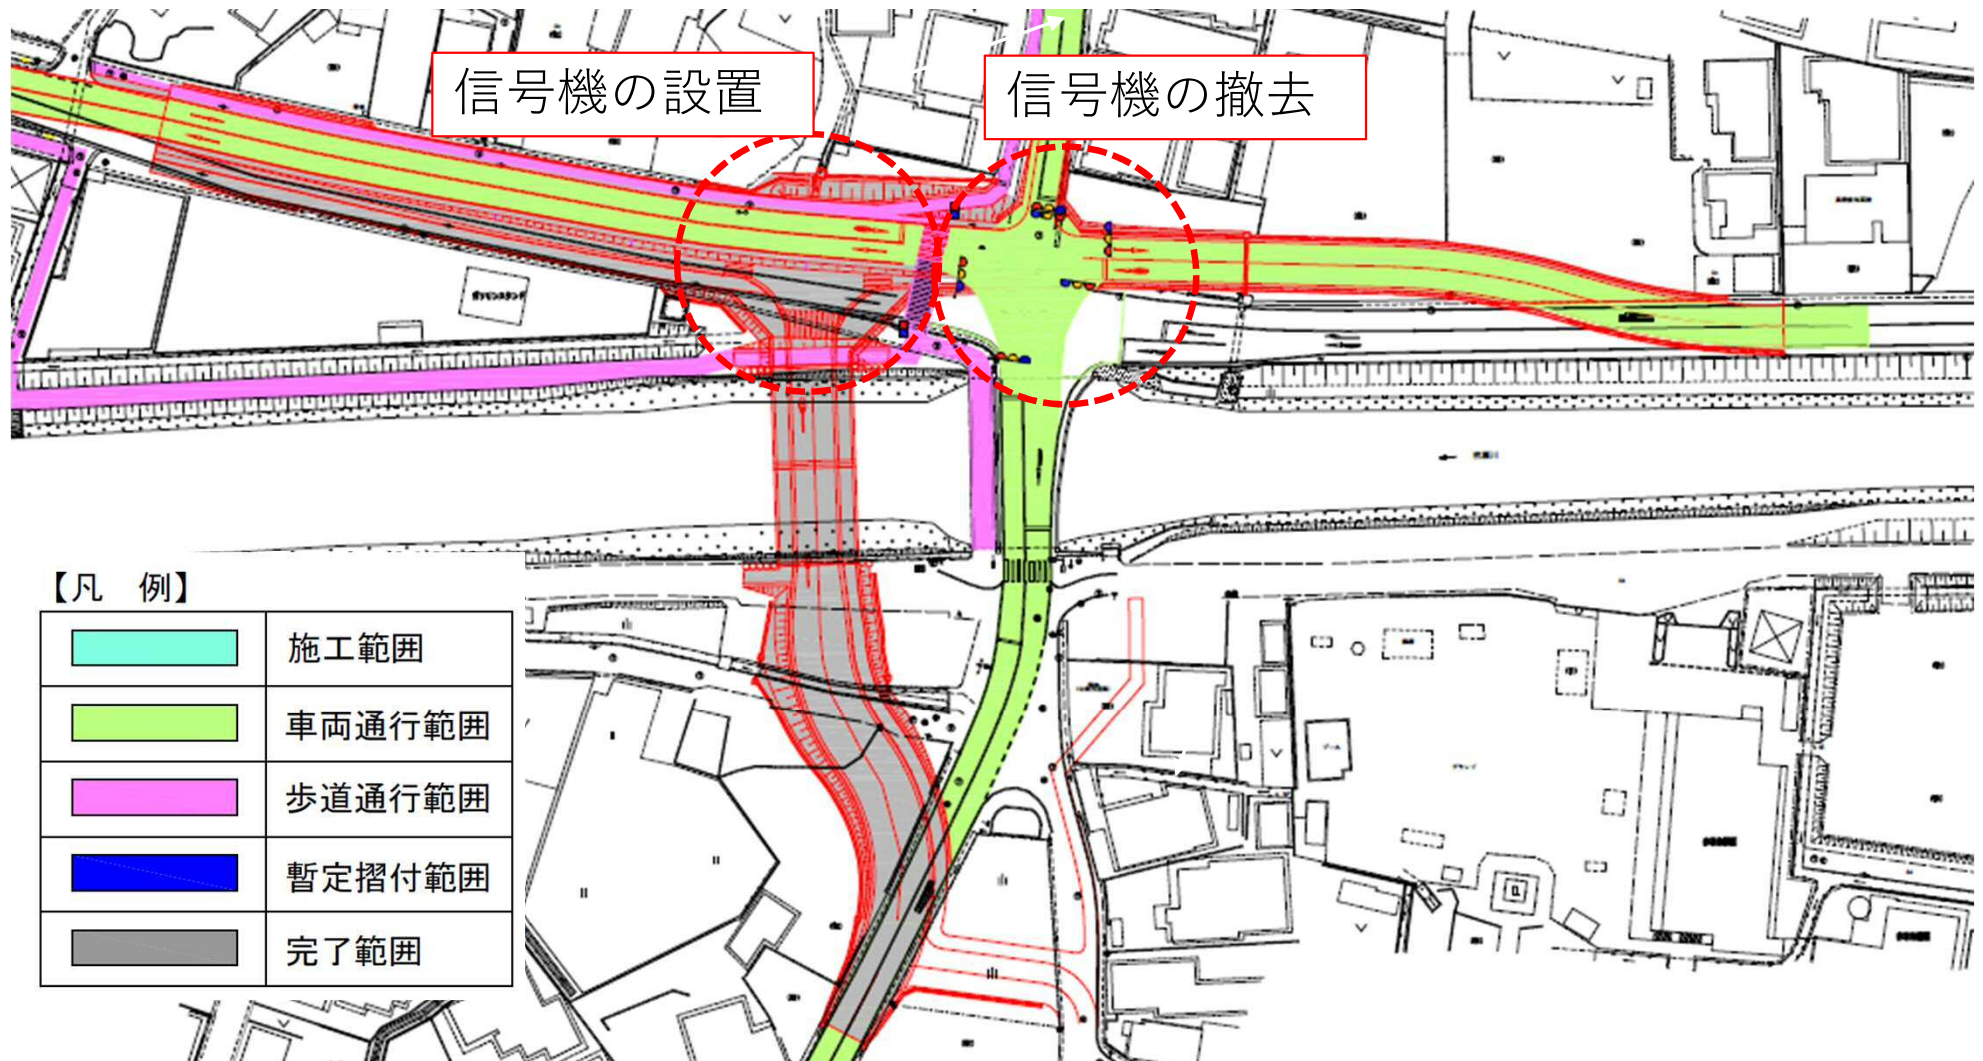


施工期間：9月中旬


施工内容：工事完了

赤坂垂井線から国道417号(大垣市内方面)への右折進入や、国道417号(池田方面)から赤坂垂井線への流出は出来なくなります。

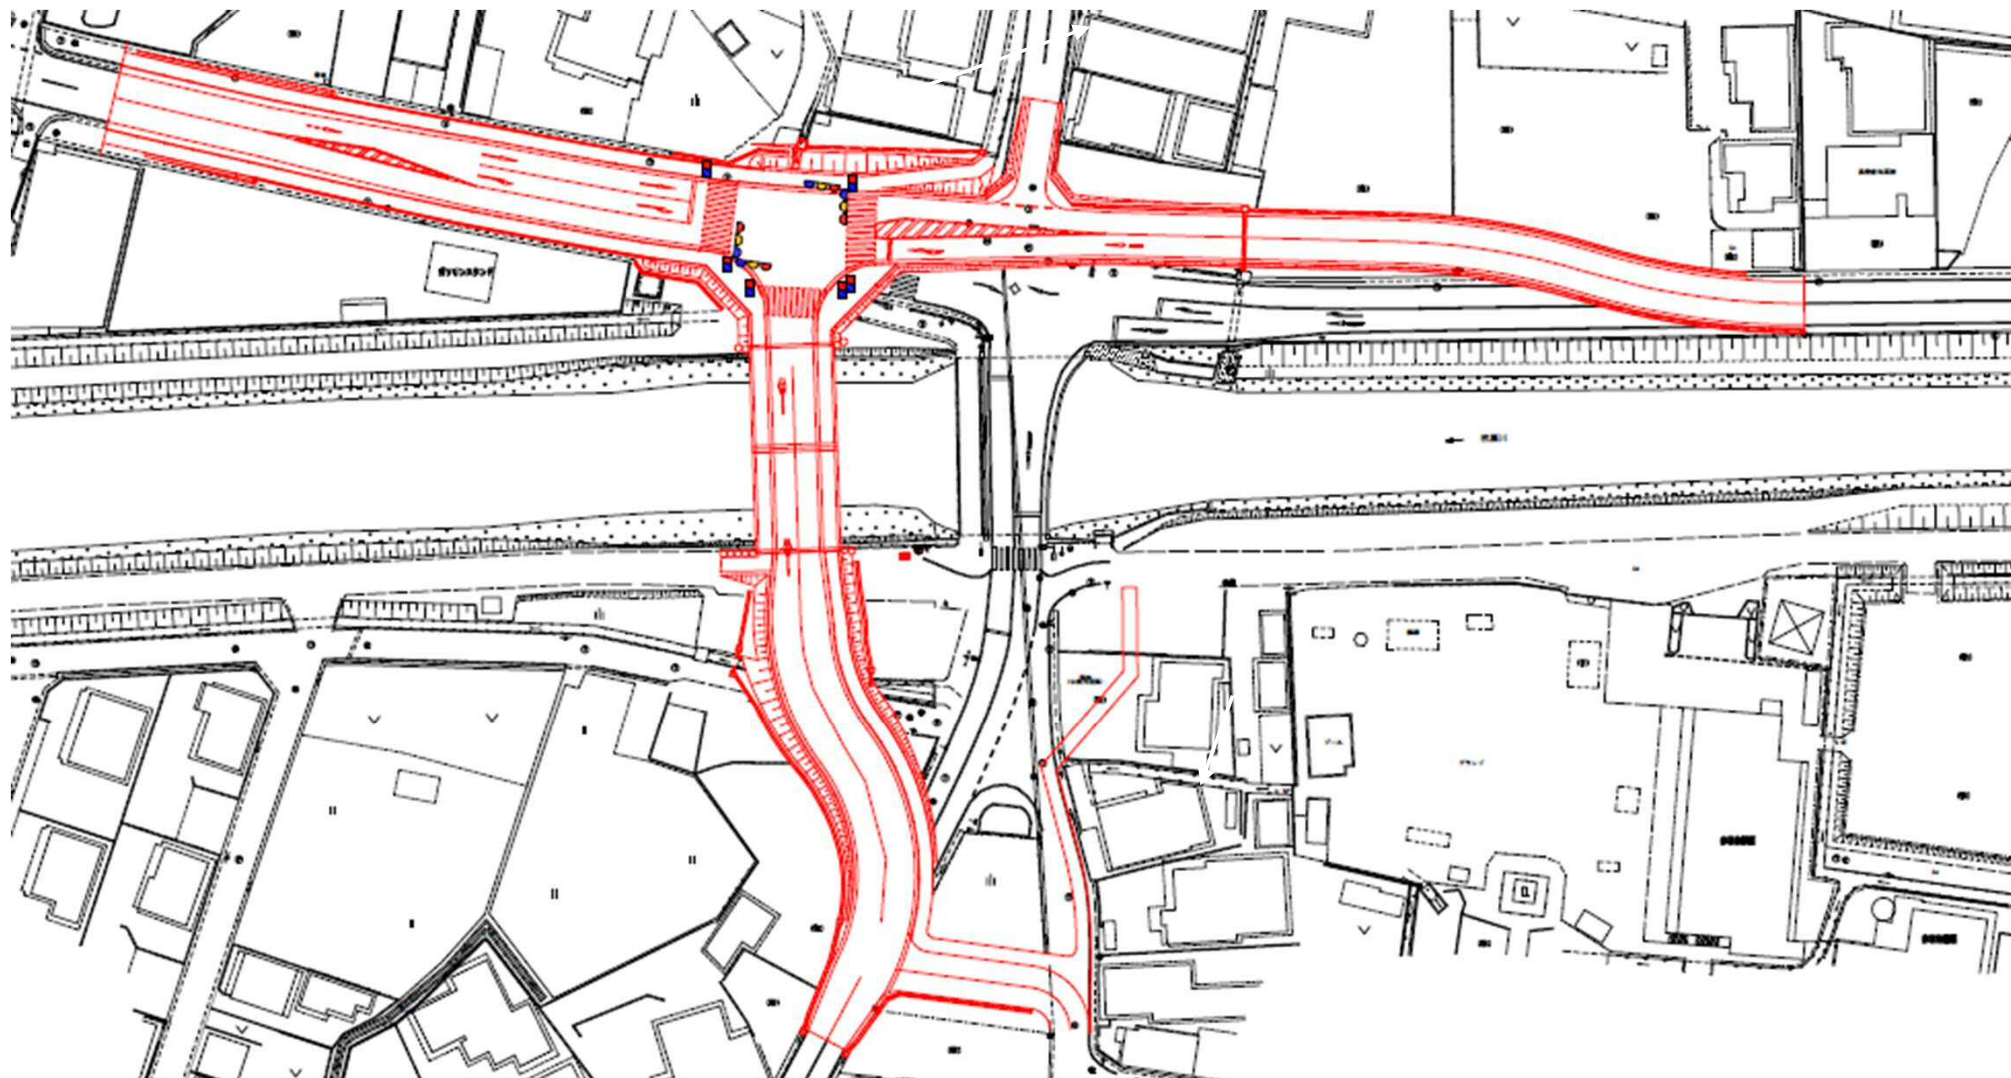

仮設道路完成後は、堤防道路を利用した矢印の3つの送迎ルートは使用できなくなります。

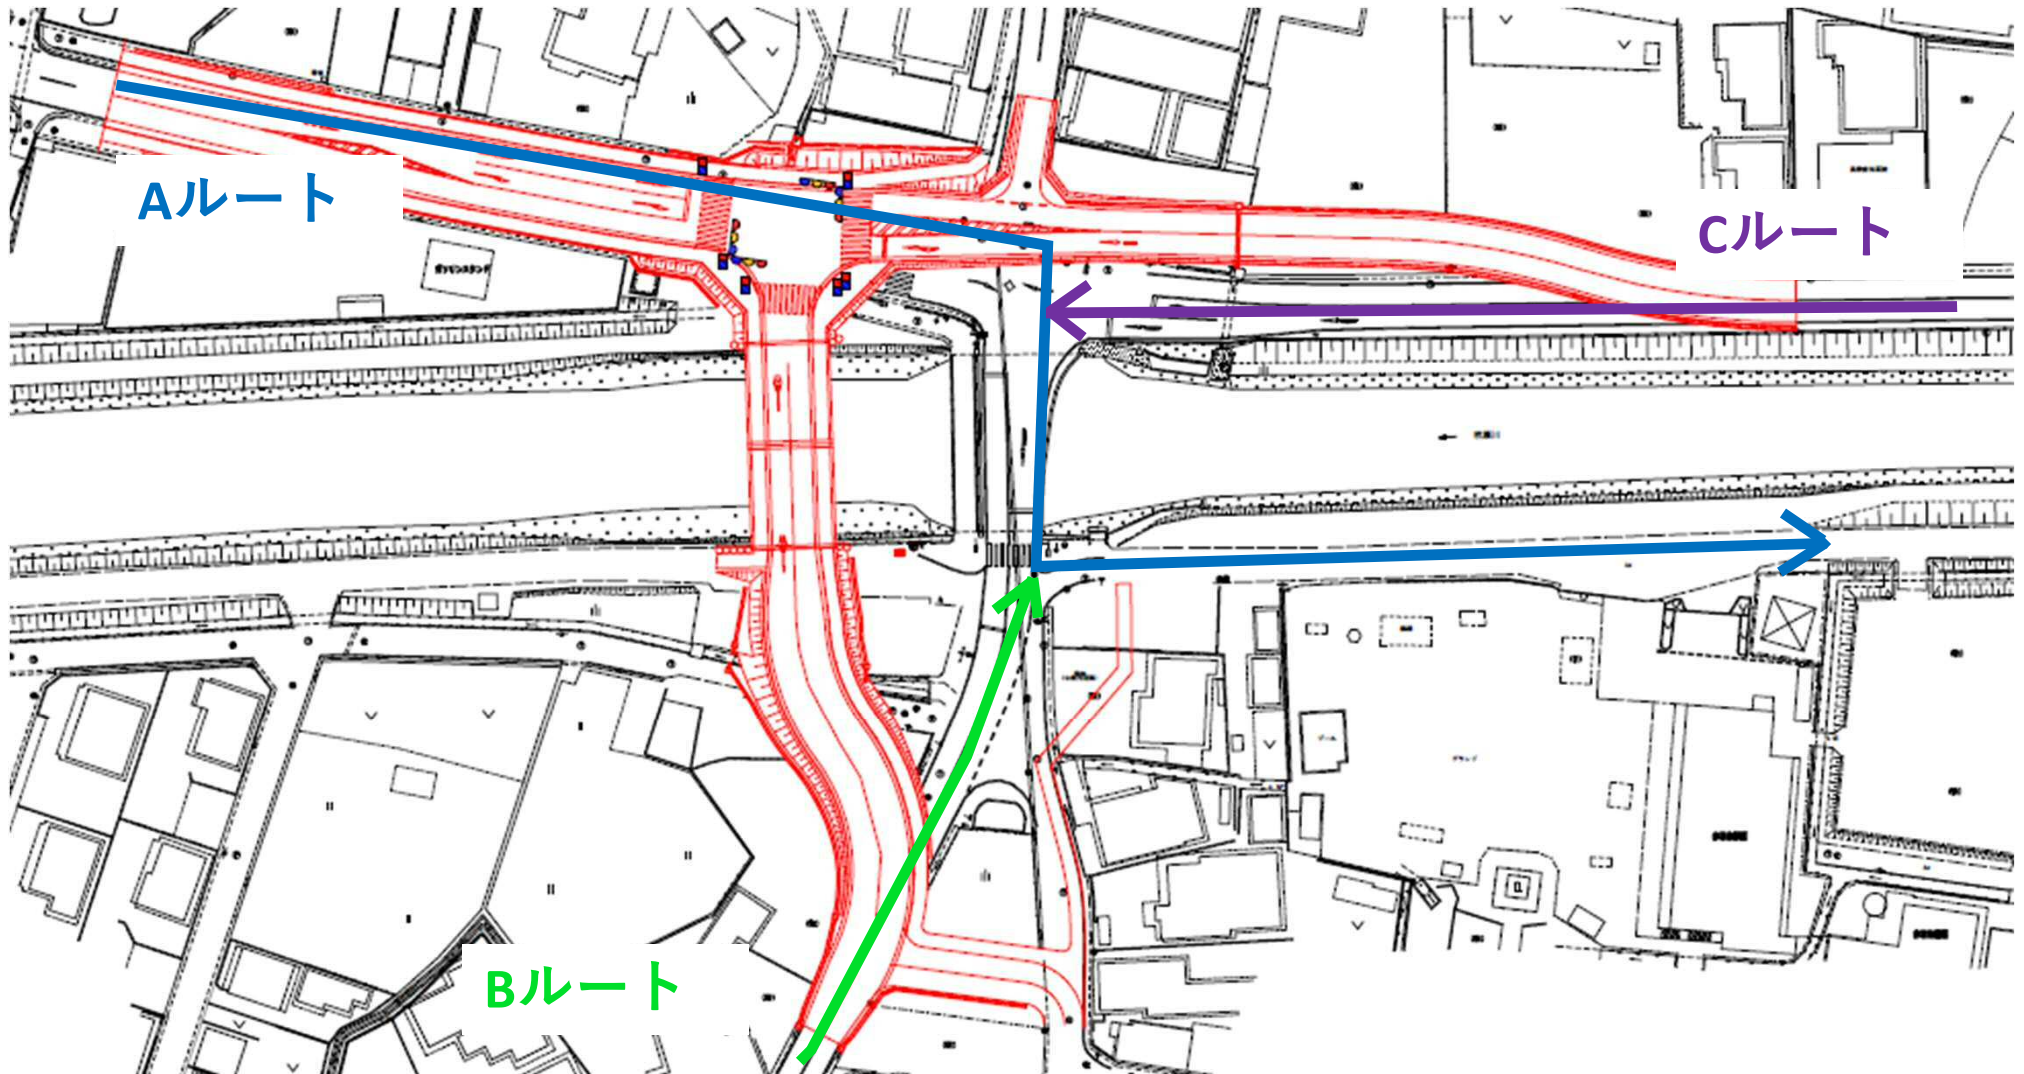

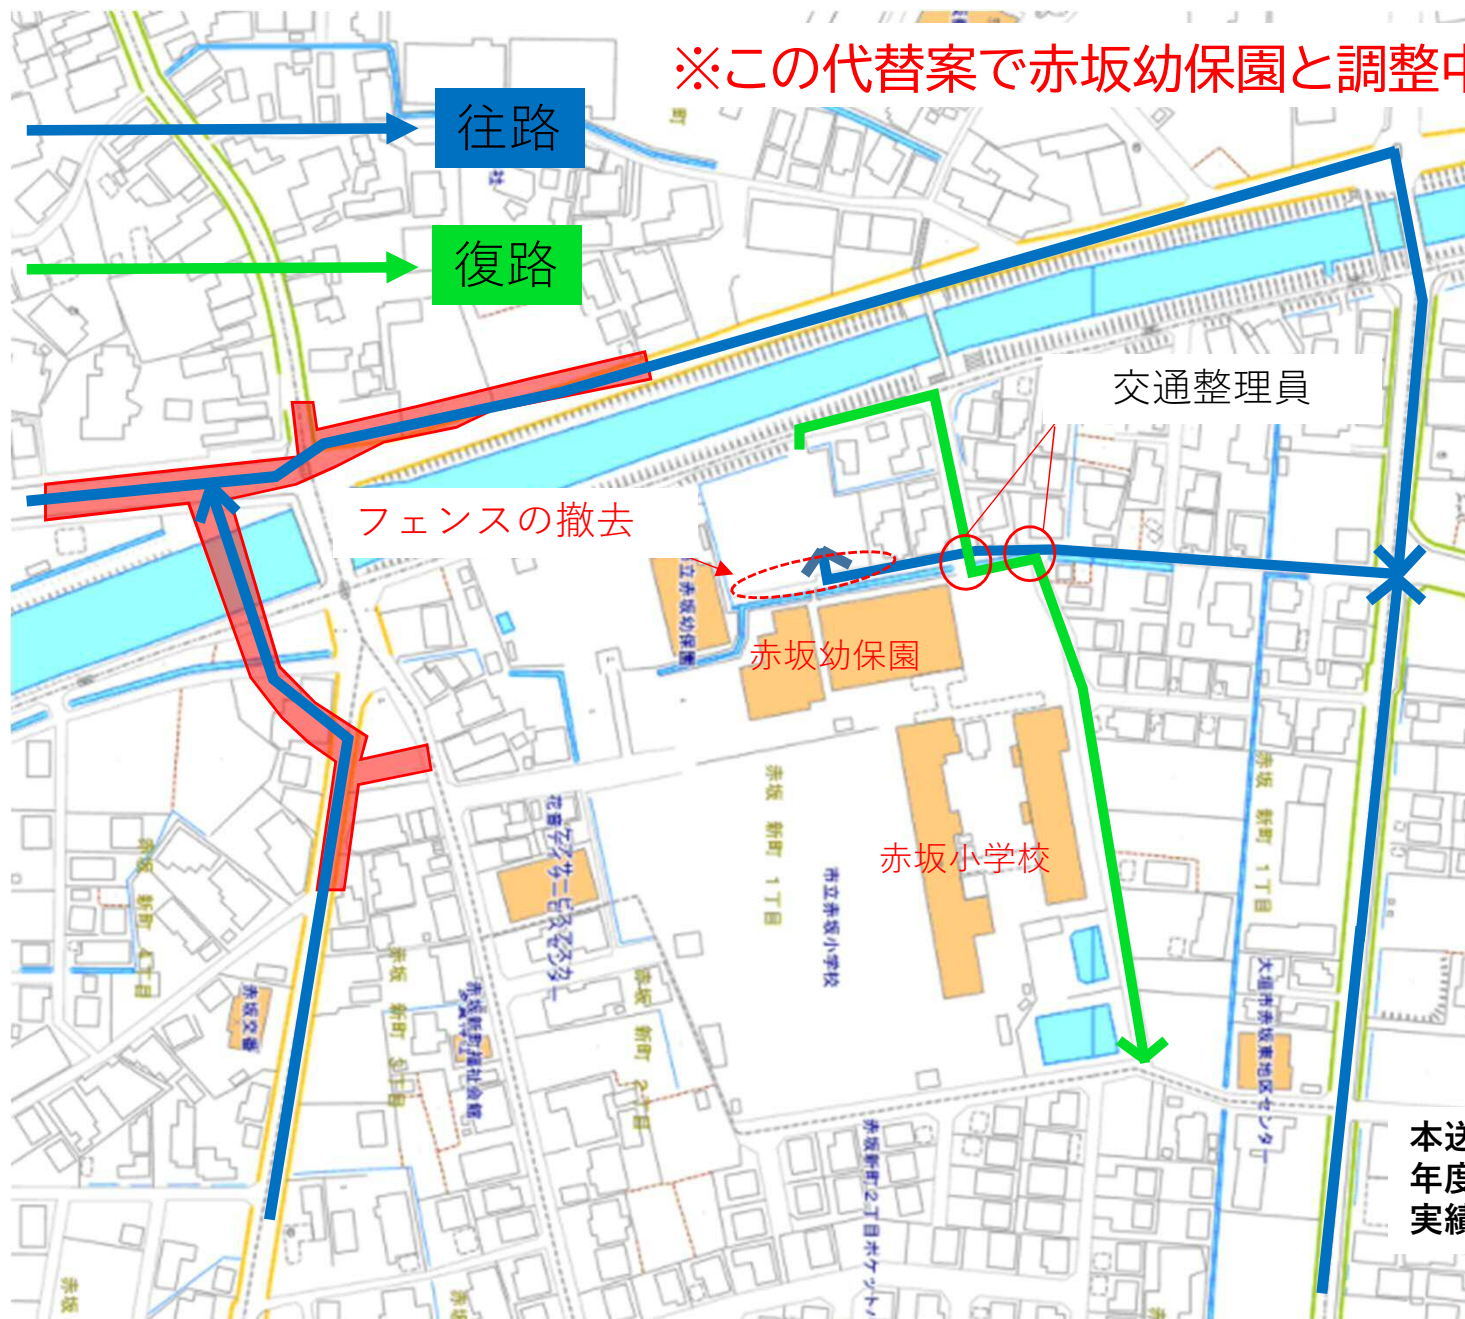

本送迎ルートは令和元年度工事において使用実績あり

